SECRETARIA-EXECUTIVA

# Novo PAC — MCid

*Balanço da carteira — da seleção à execução das obras.*

01 Seleção

02 Suspensivas

03 Licitação

04 Contratação

05 Execução

1.1 SELEÇÃO

# Carteira de seleções

ORIGEM [Migradas] [Novas] RECORTE Brasil — todas as UFs

STATUS [Selecionadas] [Enquadradas] FONTE [OGU] [FIN] ANO [23] [25] [26]

**3.507**
PROPOSTAS

**R$ 145,0 bi**
VALOR TOTAL

**R$ 41,0 bi**
OGU

**R$ 104,0 bi**
FINANCIAMENTO

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: **migradas + novas** · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | QTD. FIN | QTD. OGU | TOTAL | VALOR OGU (R$ MI) | VALOR FIN (R$ MI) | VALOR TOTAL (R$ MI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 0 | 400 | **400** | 1.044,80 | 0,00 | **1.044,80** |
| Abastecimento de Água - Urbano | 257 | 214 | **471** | 3.826,61 | 11.185,71 | **15.012,32** |
| Contenção de Encostas | 31 | 240 | **271** | 3.884,51 | 558,71 | **4.443,22** |
| Drenagem Urbana | 164 | 323 | **487** | 10.748,62 | 12.202,54 | **22.951,17** |
| Esgotamento Sanitário | 399 | 253 | **652** | 5.331,03 | 18.040,27 | **23.371,30** |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 86 | 86 | **172** | 10.165,23 | 30.293,76 | **40.458,99** |
| Regularização Fundiária | 0 | 309 | **309** | 507,75 | 0,00 | **507,75** |
| Renovação de Frota | 383 | 1 | **384** | 320,00 | 23.532,82 | **23.852,82** |
| Resíduos Sólidos | 56 | 105 | **161** | 761,90 | 458,52 | **1.220,42** |
| Urbanização de Favelas | 88 | 112 | **200** | 4.375,27 | 7.721,73 | **12.096,99** |
| **TOTAL** | **1.464** | **2.043** | **3.507** | **40.965,72** | **103.994,07** | **144.959,79** |

**3.507** *propostas* = **2.950** *novas seleções* + **557** *migradas (legado).*

EXIBIR [Valores] [% do total]

**1.2 SELEÇÃO**

# Carteira do Novo PAC por Modalidade

*Distribuição das seleções por fonte de recursos.*

ORIGEM: Migradas | Novas — RECORTE: Brasil — todas as UFs

STATUS: Selecionadas | Enquadradas — FONTE: OGU | FIN — ANO: 23 | 25 | 26

MEDIDA: Quantidade | Valor — EXIBIR: Total | %

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: **migradas + novas** · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

**3.507**
PROPOSTAS NA CARTEIRA

**OGU** 2.043 · 58,3% | **FIN** 1.464 · 41,7%

OGU · FIN · posição não utilizada

**Cada quadrado completo = 10 propostas.**

### Esgotamento Sanitário
**652** PROPOSTAS
OGU **253** 38,8%
FIN **399** 61,2%

### Drenagem Urbana
**487** PROPOSTAS
OGU **323** 66,3%
FIN **164** 33,7%

### Abastecimento de Água - Urbano
**471** PROPOSTAS
OGU **214** 45,4%
FIN **257** 54,6%

### Abastecimento de Água - Rural
**400** PROPOSTAS
OGU **400** 100,0%
FIN **0** 0,0%

### Renovação de Frota
**384** PROPOSTAS
OGU **1** 0,3%
FIN **383** 99,7%

### Regularização Fundiária
**309** PROPOSTAS
OGU **309** 100,0%
FIN **0** 0,0%

### Contenção de Encostas
**271** PROPOSTAS
OGU **240** 88,6%
FIN **31** 11,4%

### Urbanização de Favelas
**200** PROPOSTAS
OGU **112** 56,0%
FIN **88** 44,0%

### Mobilidade: Médias e Grandes Cidades
**172** PROPOSTAS
OGU **86** 50,0%
FIN **86** 50,0%

### Resíduos Sólidos
**161** PROPOSTAS
OGU **105** 65,2%
FIN **56** 34,8%

| VALOR OGU | VALOR FIN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **R$ 40.965,72 mi** | **R$ 103.994,07 mi** | **R$ 144.959,79 mi** |

*Mesmo recorte do 1.1:* **3.507** *propostas (***2.950** *novas +* **557** *migradas). Quadrado = 10 propostas; o último é parcial; cinza = posição livre (70 por modalidade).*

2.1 SUSPENSIVAS

# Cláusulas suspensivas — OGU

*Contratos OGU = sem suspensiva + suspensiva retirada + suspensiva pendente.*

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

**1.525** CONTRATOS OGU

**1.491** COM SUSPENSIVA

**1.197 · 80,3%** RETIRADAS

**294** PENDENTES

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção (sem SNH), sem cancelados · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | SEM SUSPENSIVA | COM CLÁUSULA SUSPENSIVA | | | TOTAL CONTRATOS OGU | % RETIRADA | REPASSE PENDENTE (R$ MI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RETIRADAS | PENDENTES | SUBTOTAL | | | |
| Abastecimento de Água - Rural | 8 | 173 | 130 | 303 | 311 | 57,1% | 608,52 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 1 | 175 | 7 | 182 | 183 | 96,2% | 107,55 |
| Contenção de Encostas | 0 | 127 | 45 | 172 | 172 | 73,8% | 628,16 |
| Drenagem Urbana | 0 | 208 | 59 | 267 | 267 | 77,9% | 2.156,64 |
| Esgotamento Sanitário | 2 | 121 | 6 | 127 | 129 | 95,3% | 43,77 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 3 | 61 | 1 | 62 | 65 | 98,4% | 273,23 |
| Regularização Fundiária | 20 | 210 | 26 | 236 | 256 | 89,0% | 143,99 |
| Resíduos Sólidos | 0 | 83 | 20 | 103 | 103 | 80,6% | 182,23 |
| Urbanização de Favelas | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 100,0% | 0,00 |
| **TOTAL** | **34** | **1.197** | **294** | **1.491** | **1.525** | **80,3%** | **4.144,09** |

*% retirada = retiradas ÷ contratos com cláusula suspensiva. Base:* **1.525** *contratos OGU do painelpac, sem cancelados e sem* **1** *com bln_pac = NÃO.* ver a conta passo a passo ⓘ · conta da coluna Em suspensiva (3.1) ⓘ

2.2 SUSPENSIVAS

# Alinhamento das suspensivas

*Datas de retirada pactuadas pela DMP (08/2026), por modalidade.*

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU · ANO 23 25 26

TAMANHO Repasse Contratos · MOSTRAR Todos Só pendentes

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU com data alinhada pela DMP (08/2026) · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**




círculo = data alinhada · área ∝ repasse · número = repasse somado (R$) · anel verde = fatia já retirada · data da extração

**363** *com data alinhada* = **283** *pendentes* + **79** *já retiradas* + **1** *cancelado(s) (a data vale mesmo após a retirada). As* **294** *pendentes do 2.1* = **283** *com data* + **11** *fora do alinhamento de 08/2026.* ver a conta passo a passo ⓘ

3.1 LICITAÇÃO

# Etapa atual dos contratos OGU

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

**445** AGUARDANDO LICITAÇÃO

**239** EDITAL PUBLICADO

**413** HOMOLOGADA ATÉ AIO

**428 · 28,1%** OBRA INICIADA

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção, sem cancelados — etapa mais avançada · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | SEM REGISTRO | EM SUSPENSIVA | SUSPENSIVA RETIRADA/LAE | EDITAL PUBLICADO | LICITAÇÃO HOMOLOGADA | VRPL / AIO | OBRA INICIADA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 8 | 122 | 19 | 54 | 37 | 6 | **65** | **311** |
| Abastecimento de Água - Urbano | 0 | 5 | 10 | 34 | 51 | 21 | **62** | **183** |
| Contenção de Encostas | 0 | 40 | 32 | 19 | 29 | 24 | **28** | **172** |
| Drenagem Urbana | 0 | 54 | 40 | 47 | 39 | 22 | **65** | **267** |
| Esgotamento Sanitário | 2 | 0 | 10 | 19 | 32 | 38 | **28** | **129** |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 2 | 1 | 7 | 19 | 11 | 3 | **22** | **65** |
| Regularização Fundiária | 1 | 26 | 14 | 33 | 31 | 21 | **130** | **256** |
| Resíduos Sólidos | 0 | 19 | 30 | 13 | 14 | 17 | **10** | **103** |
| Urbanização de Favelas | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | **18** | **39** |
| **TOTAL** | **13** | **267** | **165** | **239** | **248** | **165** | **428** | **1.525** |

*De **2.043** seleções OGU (slide 1.1) a **1.525** contratos OGU: migradas, seleções sem contrato, bln_pac = NÃO, sem modalidade e cancelados saem; contratos sem proposta ligada entram.* **ver a conta passo a passo** ⓘ · **conta da coluna Em suspensiva (3.1)** ⓘ

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

MEDIDA Quantidade Valor

**3.2 LICITAÇÃO**

# Régua do prazo: antes × agora

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU em Contratado - Normal, sem edital publicado · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**


A REGRA · ART. 36-A DA PC 32/2024 (INCLUÍDO PELA PC 48/2026)

LAE — até 60 dias (caput) — Edital publicado — até 120 dias (§ 1º) — Licitação homologada — VRPL — AIO — 10 dias úteis (§ 4º) — Ordem de serviço


## 96 contratos sem edital publicado · 1 ponto = 1 contrato

prazo vencido em 16/10 · vence até 30/10 · vence depois de 30/10

ANTES · MÊS DO PRAZO LEGAL (LAE + 60 DIAS)

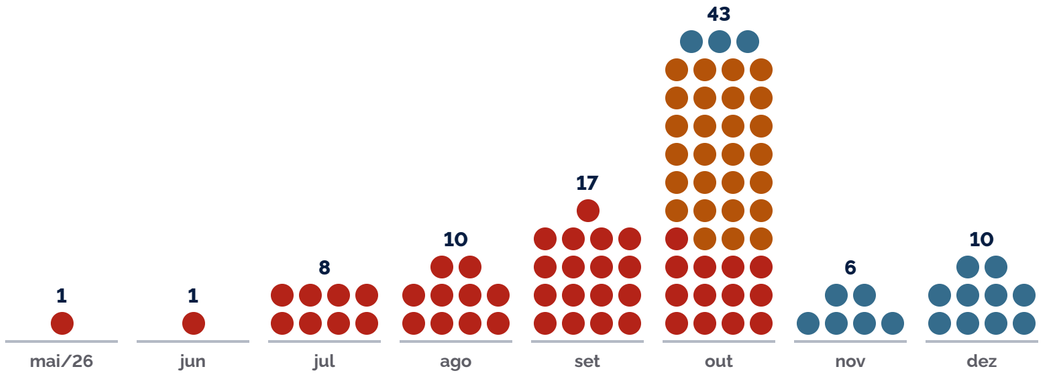


AGORA · PRAZO EFETIVO

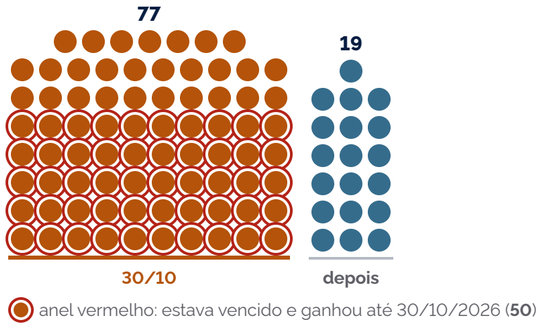


anel vermelho: estava vencido e ganhou até 30/10/2026 (**50**)

**Publicação · 96 contratos com prazo**




**Homologação · 38 contratos com prazo**




*Contratos OGU em Contratado - Normal (como no painelpac). Prazo efetivo = o maior entre o legal e 30/10/2026; antes × agora na data da extração. Ficam de fora* **60** *sem prazo (PC 72, assinados antes de 21/10/2025),* **2** *sem LAE. Clique num ponto para abrir no SACI.*

4.1 CONTRATAÇÃO

# Selecionado × contratado

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

**2.950** SELEÇÕES

**1.708** CONTRATOS ASSINADOS

**57,9%** % ASSINADO

**R$ 47,2 bi** INVESTIMENTO ASSINADO

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Contagem: novas seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | SELEÇÕES | CONTRATOS ASSINADOS | EM CONTRATAÇÃO | CANCELADOS / DISTRATADOS | % ASSINADO | INVESTIMENTO ASSINADO (R$ MI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 400 | **303** | 8 | 11 | 75,8% | 1.170,65 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 359 | **231** | 25 | 83 | 64,3% | 5.965,80 |
| Contenção de Encostas | 233 | **177** | 13 | 20 | 76,0% | 3.078,62 |
| Drenagem Urbana | 439 | **294** | 20 | 69 | 67,0% | 11.593,38 |
| Esgotamento Sanitário | 419 | **182** | 22 | 127 | 43,4% | 8.479,72 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 134 | **82** | 22 | 20 | 61,2% | 8.485,69 |
| Regularização Fundiária | 309 | **255** | 1 | 9 | 82,5% | 501,81 |
| Renovação de Frota | 384 | **27** | 18 | 57 | 7,0% | 2.052,15 |
| Resíduos Sólidos | 158 | **104** | 20 | 34 | 65,8% | 739,28 |
| Urbanização de Favelas | 115 | **53** | 32 | 30 | 46,1% | 5.104,12 |
| **TOTAL** | **2.950** | **1.708** | **181** | **460** | **57,9%** | **47.171,22** |

*Seleções = as **2.950** novas seleções do slide 1.1; as **557** migradas (legado) entram direto na execução (slides 5.1 e 5.2). Sem os **1** contratos com bln_pac = NÃO no SACI e os **19** sem modalidade (exceção provisória, a revisar). Proposta com OGU e FIN conta uma vez em cada fonte.*

4.2 CONTRATAÇÃO

# Situação dos contratos assinados

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

**1.708** ASSINADOS

**1.328** NORMAL

**338** EM SUSPENSIVA

**R$ 52,8 bi** REPASSE / FINANCIAMENTO

Atualizado em **15/10/2026** · Contagem: contratos assinados do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | NORMAL | SUSPENSIVA | CONCLUÍDO | OUTROS* | TOTAL | QTD. OGU | QTD. FIN | REPASSE / FINANC. (R$ MI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 172 | 128 | 0 | 3 | 303 | 303 | 0 | 1.026,25 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 206 | 22 | 2 | 1 | 231 | 183 | 48 | 5.737,26 |
| Contenção de Encostas | 132 | 45 | 0 | 0 | 177 | 172 | 5 | 2.972,04 |
| Drenagem Urbana | 222 | 67 | 0 | 5 | 294 | 267 | 27 | 11.219,88 |
| Esgotamento Sanitário | 157 | 19 | 0 | 6 | 182 | 127 | 55 | 7.774,04 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 72 | 3 | 5 | 2 | 82 | 64 | 18 | 13.683,47 |
| Regularização Fundiária | 228 | 26 | 0 | 1 | 255 | 255 | 0 | 486,85 |
| Renovação de Frota | 8 | 3 | 14 | 2 | 27 | 0 | 14 | 4.500,50 |
| Resíduos Sólidos | 83 | 20 | 1 | 0 | 104 | 103 | 1 | 731,08 |
| Urbanização de Favelas | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 | 39 | 14 | 4.664,86 |
| **TOTAL** | **1.328** | **338** | **22** | **20** | **1.708** | **1.513** | **182** | **52.796,24** |

** Outros: em TCE, liminar e em prestação de contas.*

4.3 CONTRATAÇÃO

# Da seleção à obra


*Quanto das seleções já virou contrato assinado, obra iniciada e obra concluída.*

ORIGEM: Migradas | **Novas** — RECORTE: Brasil — todas as UFs

FONTE: **OGU** | **FIN** — ANO: **23** | **25** | **26**

MEDIDA: **Quantidade** | Valor — EXIBIR: **Total** | %

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Contagem: seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção / Migrado (SACI) · Origem: **somente novas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

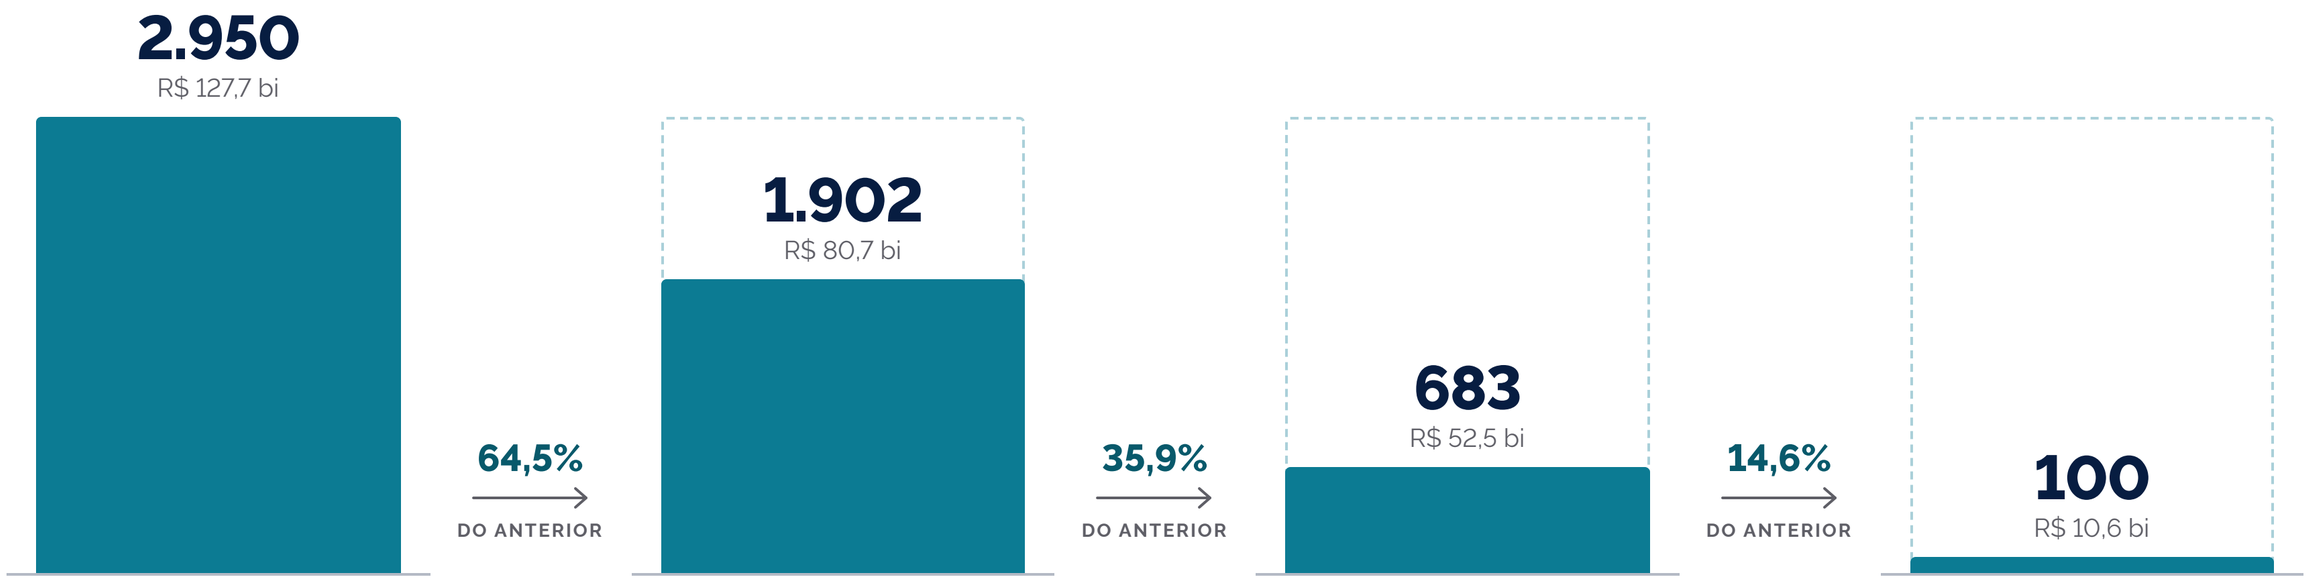


**Seleções**
portarias de 2023, 2025 e 2026

**Contratos assinados**
SACI + 194 itens só no balanço

**Obras iniciadas**
em execução 581 · paralisadas 1 · inacabadas 1

**Obras concluídas**
SACI + balanço jun/26

*Só as novas seleções, como no 4.1. Obra: SACI + balanço jun/26, com **194** itens só no balanço (valor: total previsto Novo PAC). Sem itens sem modalidade (exceção provisória, a revisar). Valor: seleções pela portaria; contratos pelo repasse do SACI. Setas: conversão sobre o bloco anterior.*

SITUAÇÃO DA OBRA: **SACI + balanço** | Só SACI

CONCLUÍDAS: **Pela situação** | + obras com ≥ 95% físico



Fonte: base GM, SACI e Balanço Governa (30/06/2026) · extração de 16/10/2026 09:10

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

SITUAÇÃO DA OBRA SACI + balanço Só SACI

5.1 EXECUÇÃO

# Situação das obras

**838** EM EXECUÇÃO

**85** PARALISADAS

**296 · 11,3%** CONCLUÍDAS

**1.397** NÃO INICIADAS

Atualizado em **15/10/2026** · Contagem: contratos do Novo PAC Seleção + Migrado (SACI), sem cancelados · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | NÃO INICIADA | EM EXECUÇÃO | PARALISADA | CONCLUÍDA | INACABADA | TOTAL | % CONCLUÍDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 247 | 64 | 0 | 0 | 0 | **311** | 0,0% |
| Abastecimento de Água - Urbano | 184 | 117 | **13** | 53 | 1 | **368** | 14,4% |
| Contenção de Encostas | 157 | 58 | **11** | 4 | 0 | **230** | 1,7% |
| Drenagem Urbana | 248 | 94 | **7** | 14 | 0 | **363** | 3,9% |
| Esgotamento Sanitário | 159 | 143 | **33** | 90 | 4 | **429** | 21,0% |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 70 | 51 | **6** | 23 | 1 | **151** | 15,2% |
| Regularização Fundiária | 131 | 123 | **1** | 0 | 1 | **256** | 0,0% |
| Renovação de Frota | 28 | 108 | 0 | 82 | 0 | **218** | 37,6% |
| Resíduos Sólidos | 111 | 13 | 0 | 3 | 0 | **127** | 2,4% |
| Urbanização de Favelas | 62 | 67 | **14** | 27 | 1 | **171** | 15,8% |
| **TOTAL** | **1.397** | **838** | **85** | **296** | **8** | **2.624** | **11,3%** |

*Total = **1.887** Novo PAC Seleção + **543** migrados + **194** itens só no balanço, sem cancelados, sem os **1** com bln_pac = NÃO e sem **38** sem modalidade (exceção provisória, a revisar). Concluídas **296** = **222** no SACI + **3** só no balanço jun/26 + **71** do balanço sem contrato no SACI (frota privada e outros); o balanço sem SNH tem **251** — a diferença são obras concluídas no SACI após junho.*

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

SITUAÇÃO DA OBRA SACI + balanço | Só SACI

5.2 EXECUÇÃO

# Execução média e paralisações

**35,9%** % FÍSICO MÉDIO

**42,1%** % FINANCEIRO MÉDIO

**85** PARALISADAS

**R$ 1,6 bi** INVESTIMENTO PARALISADO

Atualizado em **15/10/2026** · Médias: obras em execução ou paralisadas (média simples por contrato) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | % FÍSICO MÉDIO — NOVAS SELEÇÕES | % FÍSICO MÉDIO — MIGRADAS | % FÍSICO MÉDIO — TOTAL | % FINANCEIRO MÉDIO | PARALISADAS | INVESTIMENTO PARALISADO (R$ MI) | CONCLUÍDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 20,7% | — | **20,7%** | 18,8% | 0 | 0,00 | 0 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 20,1% | 61,0% | **39,6%** | 41,9% | **13** | 116,73 | 53 |
| Contenção de Encostas | 15,1% | 24,3% | **19,8%** | 24,3% | **11** | 133,90 | 4 |
| Drenagem Urbana | 13,1% | 55,3% | **28,6%** | 30,0% | **7** | 337,26 | 14 |
| Esgotamento Sanitário | 24,3% | 57,6% | **48,9%** | 45,0% | **33** | 513,59 | 90 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 18,2% | 56,7% | **31,7%** | 32,9% | **6** | 403,40 | 23 |
| Regularização Fundiária | 22,1% | — | **22,1%** | 74,5% | **1** | 3,03 | 0 |
| Renovação de Frota | 52,4% | — | **52,4%** | 15,5% | 0 | 0,00 | 82 |
| Resíduos Sólidos | 10,1% | — | **10,1%** | 27,6% | 0 | 0,00 | 3 |
| Urbanização de Favelas | 5,5% | 59,9% | **43,1%** | 42,7% | **14** | 101,32 | 27 |
| **TOTAL** | **24,9%** | **54,8%** | **35,9%** | **42,1%** | **85** | **1.609,24** | **296** |

*Investimento paralisado: migradas pelo valor da base GM (pós-2023); demais pelo investimento do SACI. Situação da obra pelo SACI + balanço jun/26 (+ **194** itens do balanço sem contrato no SACI, com o % físico do balanço).*

# Obrigado.

*Novo PAC — Ministério das Cidades.*

**SELEÇÃO**
Base única GM (se_cgpac) · atualizada em 09/10/2026

**SUSPENSIVAS E LICITAÇÃO**
painelpac — SACI 15/10 · Transferegov 15/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10

**EXTRAÇÃO DO BANCO**
16/10/2026 às 09:10

**CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO**
SACI — view_mat_carteira_investimento · 15/10/2026

**SITUAÇÃO DAS OBRAS (2ª FONTE)**
Balanço Governa — se_cgpac.balancojun2026_com_inativas · referência 30/06/2026
