SECRETARIA-EXECUTIVA

Novo PAC — MCid

Balanço da carteira — da seleção à execução das obras.

01 **Seleção**

02 **Suspensivas**

03 **Licitação**

04 **Contratação**

05 **Execução**

1.1 SELEÇÃO

Carteira de seleções

ORIGEM [Migradas] [Novas] RECORTE Brasil — todas as UFs

STATUS [Selecionadas] [Enquadradas] FONTE [OGU] [FIN] ANO [23] [25] [26]

3.507
PROPOSTAS

R$ 145,0 bi
VALOR TOTAL

R$ 41,0 bi
OGU

R$ 104,0 bi
FINANCIAMENTO

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: **migradas + novas** · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	QTD. FIN	QTD. OGU	TOTAL	VALOR OGU (R$ MI)	VALOR FIN (R$ MI)	VALOR TOTAL (R$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	0	400	**400**	1.044,80	0,00	**1.044,80**
Abastecimento de Água - Urbano	257	214	**471**	3.826,61	11.185,71	**15.012,32**
Contenção de Encostas	31	240	**271**	3.884,51	558,71	**4.443,22**
Drenagem Urbana	164	323	**487**	10.748,62	12.202,54	**22.951,17**
Esgotamento Sanitário	399	253	**652**	5.331,03	18.040,27	**23.371,30**
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	86	86	**172**	10.165,23	30.293,76	**40.458,99**
Regularização Fundiária	0	309	**309**	507,75	0,00	**507,75**
Renovação de Frota	383	1	**384**	320,00	23.532,82	**23.852,82**
Resíduos Sólidos	56	105	**161**	761,90	458,52	**1.220,42**
Urbanização de Favelas	88	112	**200**	4.375,27	7.721,73	**12.096,99**
TOTAL	**1.464**	**2.043**	**3.507**	**40.965,72**	**103.994,07**	**144.959,79**

3.507 *propostas =* **2.950** *novas seleções (detalhadas por ano no slide 1.2) +* **557** *migradas (legado).*

EXIBIR [Valores] [% do total]

1.2
SELEÇÃO

Novas seleções por ano

Portarias de 2023, 2025 e 2026 — selecionadas e enquadradas/habilitadas.

RECORTE Brasil — todas as UFs

STATUS Selecionadas | Enquadradas FONTE OGU | FIN ANO 23 | 25 | 26

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: novas seleções, sem migradas · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

	QUANTIDADE				VALOR (R$ MI)			
MODALIDADE	2023	2025	2026	TOTAL	2023	2025	2026	TOTAL
Abastecimento de Água - Rural	247	153	0	**400**	400,00	644,80	0,00	**1.044,80**
Abastecimento de Água - Urbano	271	51	37	**359**	6.770,16	4.743,78	1.046,72	**12.560,65**
Contenção de Encostas	122	103	8	**233**	1.702,69	1.432,34	476,83	**3.611,86**
Drenagem Urbana	221	187	31	**439**	9.305,93	9.068,91	2.044,35	**20.419,20**
Esgotamento Sanitário	302	55	62	**419**	10.201,54	4.973,86	2.029,32	**17.204,72**
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	86	21	27	**134**	21.708,01	5.693,15	9.002,14	**36.403,30**
Regularização Fundiária	259	0	50	**309**	313,01	0,00	194,74	**507,75**
Renovação de Frota	111	170	103	**384**	11.512,38	5.528,74	6.811,69	**23.852,82**
Resíduos Sólidos	81	72	5	**158**	703,11	476,19	10,20	**1.189,50**
Urbanização de Favelas	59	38	18	**115**	5.267,76	3.674,21	1.949,26	**10.891,24**
TOTAL	**1.759**	**850**	**341**	**2.950**	**67.884,58**	**36.235,98**	**23.565,27**	**127.685,84**

*Somadas as **557** migradas (legado), são **3.507** propostas — o total do slide 1.1.*

2.1 SUSPENSIVAS

Cláusulas suspensivas — OGU

Contratos OGU = sem suspensiva + suspensiva retirada + suspensiva pendente.

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

1.582
CONTRATOS OGU

1.491
COM SUSPENSIVA

1.197 · 80,3%
RETIRADAS

294
PENDENTES

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção (sem SNH), sem cancelados · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

		COM CLÁUSULA SUSPENSIVA					
MODALIDADE	SEM SUSPENSIVA	RETIRADAS	PENDENTES	SUBTOTAL	TOTAL CONTRATOS OGU	% RETIRADA	REPASSE PENDENTE (R$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	8	173	130	303	311	57,1%	608,52
Abastecimento de Água - Urbano	1	175	7	182	183	96,2%	107,55
Contenção de Encostas	0	127	45	172	172	73,8%	628,16
Drenagem Urbana	0	208	59	267	267	77,9%	2.156,64
Esgotamento Sanitário	2	121	6	127	129	95,3%	43,77
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	3	61	1	62	65	98,4%	273,23
Regularização Fundiária	20	210	26	236	256	89,0%	143,99
Resíduos Sólidos	0	83	20	103	103	80,6%	182,23
Urbanização de Favelas	0	39	0	39	39	100,0%	0,00
Outras / sem modalidade	57	0	0	0	57	—	0,00
TOTAL	**91**	**1.197**	**294**	**1.491**	**1.582**	**80,3%**	**4.144,09**

% retirada = retiradas ÷ contratos com cláusula suspensiva.

2.2 SUSPENSIVAS

Prazo das suspensivas pendentes

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

294 PENDENTES

263 PRAZO INICIAL VENCIDO

32 TETO DA PRORROGAÇÃO VENCIDO

1 VENCEM EM 30 DIAS

Situação em **15/10/2026** · Contagem: suspensivas pendentes (OGU) · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

		PRAZO INICIAL (PC 48/2026)				
MODALIDADE	PENDENTES	NO PRAZO	VENCE EM 30 DIAS	VENCIDO	TETO DA PRORROGAÇÃO VENCIDO	SEM PRAZO CALCULADO
Abastecimento de Água - Rural	130	0	1	127	0	2
Abastecimento de Água - Urbano	7	0	0	7	7	0
Contenção de Encostas	45	0	0	45	0	0
Drenagem Urbana	59	0	0	59	0	0
Esgotamento Sanitário	6	0	0	4	4	2
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	1	0	0	1	1	0
Regularização Fundiária	26	26	0	0	0	0
Resíduos Sólidos	20	0	0	20	20	0
TOTAL	**294**	**26**	**1**	**263**	**32**	**4**

Prazo contado da assinatura (PC 48/2026, art. 12): 6, 8 ou 10 meses conforme o nível do contrato; prorrogação única até 8, 12 ou 14 meses. Situação em 15/10/2026.

2.3 SUSPENSIVAS

Alinhamento das suspensivas

Datas de retirada das suspensivas pactuadas pela DMP em 08/2026, por modalidade.

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU | ANO 23 25 26

TAMANHO Repasse | Contratos

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU com data alinhada pela DMP (08/2026) · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**



círculo = data alinhada · área ∝ repasse · número = contratos anel verde = fatia já retirada data da extração

363 *com data alinhada =* **283** *pendentes +* **79** *já retiradas +* **1** *cancelado(s) — a data é fixa e continua valendo depois da retirada. As* **294** *pendentes do slide 2.1 =* **283** *com data alinhada +* **11** *sem data (contratos que não entraram no alinhamento de 08/2026).*

3.1 LICITAÇÃO

Etapa atual dos contratos OGU

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

496
AGUARDANDO LICITAÇÃO

239
EDITAL PUBLICADO

419
HOMOLOGADA ATÉ AIO

428 · 27,1%
OBRA INICIADA

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção, sem cancelados — etapa mais avançada · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	SEM REGISTRO	EM SUSPENSIVA	SUSPENSIVA RETIRADA/LAE	EDITAL PUBLICADO	LICITAÇÃO HOMOLOGADA	VRPL / AIO	OBRA INICIADA	TOTAL
Abastecimento de Água - Rural	8	122	19	54	37	6	**65**	**311**
Abastecimento de Água - Urbano	0	5	10	34	51	21	**62**	**183**
Contenção de Encostas	0	40	32	19	29	24	**28**	**172**
Drenagem Urbana	0	54	40	47	39	22	**65**	**267**
Esgotamento Sanitário	2	0	10	19	32	38	**28**	**129**
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	2	1	7	19	11	3	**22**	**65**
Regularização Fundiária	1	26	14	33	31	21	**130**	**256**
Resíduos Sólidos	0	19	30	13	14	17	**10**	**103**
Urbanização de Favelas	0	0	3	1	4	13	**18**	**39**
Outras / sem modalidade	51	0	0	0	6	0	0	**57**
TOTAL	**64**	**267**	**165**	**239**	**254**	**165**	**428**	**1.582**

3.2 LICITAÇÃO

Prazos da licitação — art. 36-A

Publicação em até 60 dias da LAE e homologação em até 120 dias da publicação — data-limite de 30/10/2026.

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU assinados após a PC 72/2025, com LAE · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

	PUBLICAÇÃO DO EDITAL				HOMOLOGAÇÃO			
MODALIDADE	PUBLICADO	NO PRAZO	VENCE EM 30 DIAS	VENCIDO	HOMOLOGADA	NO PRAZO	VENCE EM 30 DIAS	VENCIDO
Abastecimento de Água - Rural	**2**	7	9	0	**8**	0	0	0
Abastecimento de Água - Urbano	**1**	0	0	0	**1**	1	0	0
Contenção de Encostas	**23**	5	23	0	**16**	9	1	0
Drenagem Urbana	**37**	2	31	0	**25**	10	6	0
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	**1**	0	1	0	**2**	0	0	0
Regularização Fundiária	**15**	0	9	0	**8**	3	4	0
Resíduos Sólidos	**6**	0	11	0	**4**	4	1	0
Outras / sem modalidade	0	0	0	0	**1**	0	0	0
TOTAL	**85**	**14**	**84**	**0**	**65**	**27**	**12**	**0**

Prazos vencidos ou vencendo antes de 30/10/2026 passam para 30/10/2026 (regra do painelpac). Situação em 15/10/2026.

4.1 CONTRATAÇÃO

Selecionado × contratado

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

2.950 SELEÇÕES

1.742 CONTRATOS ASSINADOS

59,1% % ASSINADO

R$ 47,6 bi INVESTIMENTO ASSINADO

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Contagem: novas seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	SELEÇÕES	CONTRATOS ASSINADOS	EM CONTRATAÇÃO	CANCELADOS / DISTRATADOS	% ASSINADO	INVESTIMENTO ASSINADO (R$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	400	**303**	8	11	75,8%	1.170,65
Abastecimento de Água - Urbano	359	**231**	25	83	64,3%	5.965,80
Contenção de Encostas	233	**177**	13	20	76,0%	3.078,62
Drenagem Urbana	439	**294**	20	69	67,0%	11.593,38
Esgotamento Sanitário	419	**182**	22	127	43,4%	8.479,72
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	134	**82**	22	20	61,2%	8.485,69
Regularização Fundiária	309	**255**	1	9	82,5%	501,81
Renovação de Frota	384	**27**	18	57	7,0%	2.052,15
Resíduos Sólidos	158	**104**	20	34	65,8%	739,28
Urbanização de Favelas	115	**53**	32	30	46,1%	5.104,12
Outras / sem modalidade	0	**34**	42	1	—	421,45
TOTAL	**2.950**	**1.742**	**223**	**461**	**59,1%**	**47.592,67**

*Seleções = as **2.950** novas seleções do slide 1.2; as **557** migradas (legado) entram direto na execução (slides 5.1 e 5.2). Proposta com OGU e FIN conta uma vez em cada fonte.*

4.2 CONTRATAÇÃO

Situação dos contratos assinados

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

1.742 ASSINADOS

1.362 NORMAL

338 EM SUSPENSIVA

R$ 53,2 bi REPASSE / FINANCIAMENTO

Atualizado em **15/10/2026** · Contagem: contratos assinados do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	NORMAL	SUSPENSIVA	CONCLUÍDO	OUTROS*	TOTAL	QTD. OGU	QTD. FIN	REPASSE / FINANC. (R$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	172	128	0	3	303	303	0	1.026,25
Abastecimento de Água - Urbano	206	22	2	1	231	183	48	5.737,26
Contenção de Encostas	132	45	0	0	177	172	5	2.972,04
Drenagem Urbana	222	67	0	5	294	267	27	11.219,88
Esgotamento Sanitário	157	19	0	6	182	127	55	7.774,04
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	72	3	5	2	82	64	18	13.683,47
Regularização Fundiária	228	26	0	1	255	255	0	486,85
Renovação de Frota	8	3	14	2	27	0	14	4.500,50
Resíduos Sólidos	83	20	1	0	104	103	1	731,08
Urbanização de Favelas	48	5	0	0	53	39	14	4.664,86
Outras / sem modalidade	34	0	0	0	34	16	18	401,83
TOTAL	**1.362**	**338**	**22**	**20**	**1.742**	**1.529**	**200**	**53.198,07**

** Outros: em TCE, liminar e em prestação de contas.*

4.3 CONTRATAÇÃO

Da seleção à obra


Quanto das seleções já virou contrato assinado, obra iniciada e obra concluída.

ORIGEM [Migradas] [Novas] RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE [OGU] [FIN] ANO [23] [25] [26]

MEDIDA [Quantidade] [Valor] EXIBIR [Total] [%]

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Contagem: seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção / Migrado (SACI) · Origem: **somente novas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

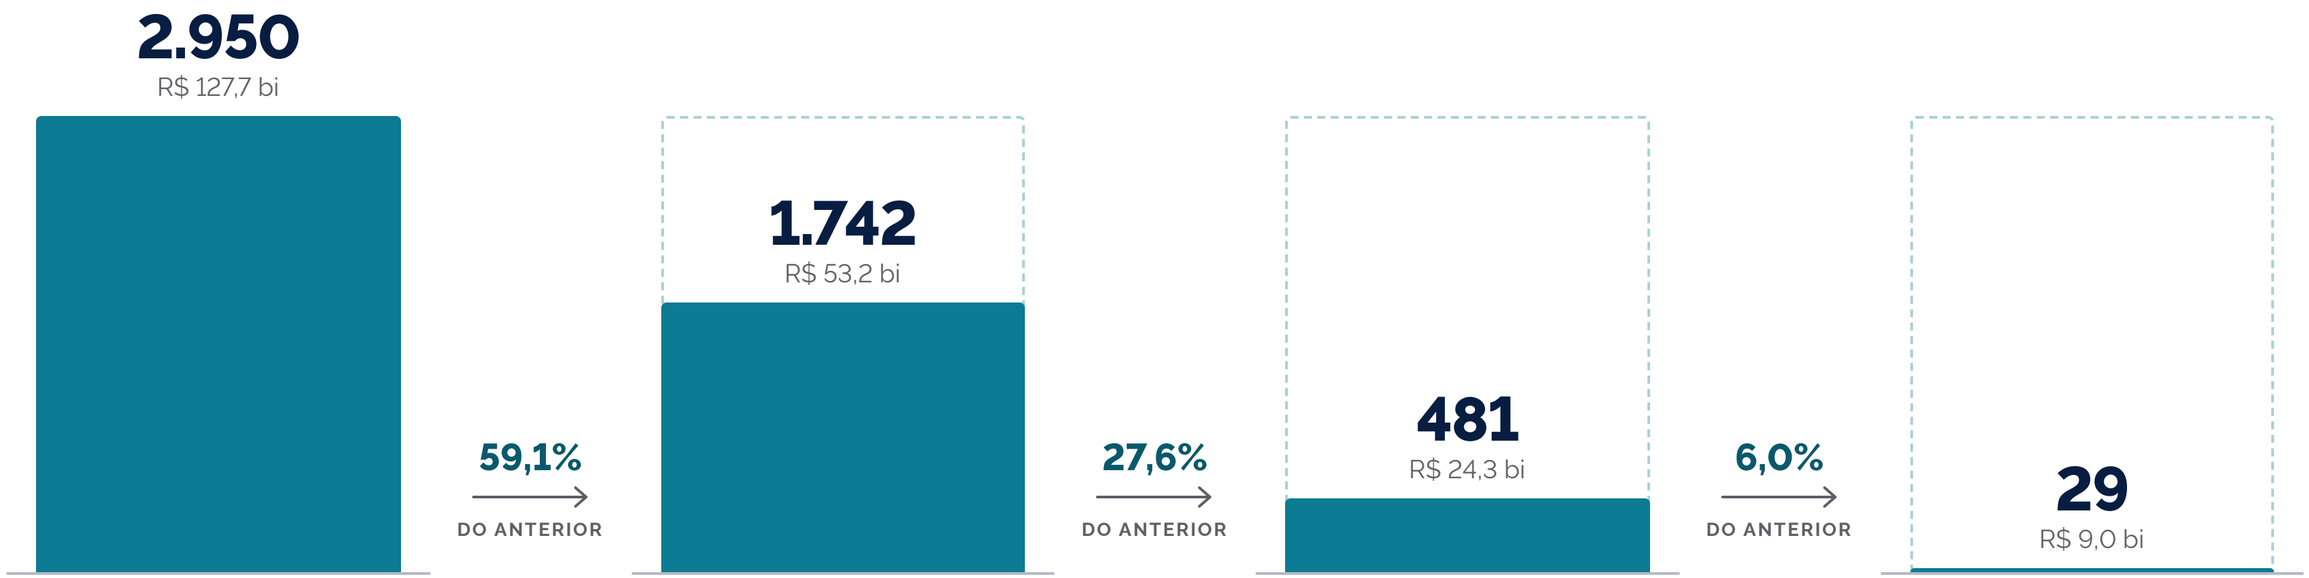

Só as novas seleções, como no slide 4.1 (ligue Migradas para incluir o legado). Valor: seleções pela portaria (OGU + FIN); contratos e obras das novas seleções pelo repasse/financiamento do SACI. Setas: conversão em relação ao bloco anterior.

CONCLUÍDAS [Situação no SACI] [+ obras com ≥ 95% físico]

Fonte: base única GM e SACI (view_mat_carteira_investimento) · extração de 15/10/2026 18:11

5.1 EXECUÇÃO

Situação das obras

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

707 EM EXECUÇÃO

85 PARALISADAS

222 · 9,0% CONCLUÍDAS

1.440 NÃO INICIADAS

Atualizado em **15/10/2026** · Contagem: contratos do Novo PAC Seleção + Migrado (SACI), sem cancelados · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	NÃO INICIADA	EM EXECUÇÃO	PARALISADA	CONCLUÍDA	INACABADA	TOTAL	% CONCLUÍDA
Abastecimento de Água - Rural	248	63	0	0	0	**311**	0,0%
Abastecimento de Água - Urbano	184	115	**13**	52	1	**365**	14,2%
Contenção de Encostas	157	57	**11**	3	0	**228**	1,3%
Drenagem Urbana	257	82	**7**	14	0	**360**	3,9%
Esgotamento Sanitário	160	141	**33**	88	4	**426**	20,7%
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	74	39	**6**	21	1	**141**	14,9%
Regularização Fundiária	149	105	**1**	0	1	**256**	0,0%
Renovação de Frota	28	3	0	14	0	**45**	31,1%
Resíduos Sólidos	111	12	0	3	0	**126**	2,4%
Urbanização de Favelas	62	65	**14**	27	1	**169**	16,0%
Outras / sem modalidade	10	25	0	0	0	**35**	0,0%
TOTAL	**1.440**	**707**	**85**	**222**	**8**	**2.462**	**9,0%**

*Total = **1.921** contratos do Novo PAC Seleção (assinados ou em contratação) + **541** migrados, sem contratos cancelados/distratados nem obras canceladas.*

5.2 EXECUÇÃO

Execução média e paralisações

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

35,4% % FÍSICO MÉDIO

41,6% % FINANCEIRO MÉDIO

85 PARALISADAS

R$ 1,6 bi INVESTIMENTO PARALISADO

Atualizado em **15/10/2026** · Médias: obras em execução ou paralisadas (média simples por contrato) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	% FÍSICO MÉDIO — NOVAS SELEÇÕES	% FÍSICO MÉDIO — MIGRADAS	% FÍSICO MÉDIO — TOTAL	% FINANCEIRO MÉDIO	PARALISADAS	INVESTIMENTO PARALISADO (R$ MI)	CONCLUÍDAS
Abastecimento de Água - Rural	21,0%	—	**21,0%**	17,5%	0	0,00	0
Abastecimento de Água - Urbano	19,1%	61,0%	**39,4%**	41,9%	**13**	116,73	52
Contenção de Encostas	15,5%	24,3%	**20,0%**	24,3%	**11**	133,90	3
Drenagem Urbana	13,8%	56,8%	**31,2%**	31,3%	**7**	337,26	14
Esgotamento Sanitário	23,6%	58,5%	**49,9%**	45,8%	**33**	513,59	88
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	14,6%	58,3%	**35,0%**	35,6%	**6**	403,40	21
Regularização Fundiária	25,9%	—	**25,9%**	73,9%	**1**	3,03	0
Renovação de Frota	12,0%	—	**12,0%**	15,5%	0	0,00	14
Resíduos Sólidos	10,9%	—	**10,9%**	27,6%	0	0,00	3
Urbanização de Favelas	1,7%	59,9%	**42,9%**	42,7%	**14**	101,32	27
Outras / sem modalidade	46,6%	—	**46,6%**	17,5%	0	0,00	0
TOTAL	**19,7%**	**55,5%**	**35,4%**	**41,6%**	**85**	**1.609,24**	**222**

Investimento paralisado: migradas pelo valor da base GM (pós-2023: repasse menos o desembolsado até 2022); novas seleções pelo investimento do SACI.

Obrigado.

Novo PAC — Ministério das Cidades.

SELEÇÃO
Base única GM (se_cgpac) · atualizada em 09/10/2026

SUSPENSIVAS E LICITAÇÃO
painelpac — SACI 15/10 · Transferegov 15/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10

CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO
SACI — view_mat_carteira_investimento · 15/10/2026

EXTRAÇÃO DO BANCO
15/10/2026 às 18:11
