SECRETARIA-EXECUTIVA

Novo PAC — MCid

Balanço da carteira — da seleção à execução das obras.

01 **Seleção**

02 **Suspensivas**

03 **Licitação**

04 **Contratação**

05 **Execução**

1.1 SELEÇÃO

Carteira de seleções

ORIGEM [Migradas] [Novas] RECORTE Brasil — todas as UFs

STATUS [Selecionadas] [Enquadradas] FONTE [OGU] [FIN] ANO [23] [25] [26]

3.507
PROPOSTAS

R$ 145,0 bi
VALOR TOTAL

R$ 41,0 bi
OGU

R$ 104,0 bi
FINANCIAMENTO

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: **migradas + novas** · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	QTD. FIN	QTD. OGU	TOTAL	VALOR OGU (R$ MI)	VALOR FIN (R$ MI)	VALOR TOTAL (R$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	0	400	**400**	1.044,80	0,00	**1.044,80**
Abastecimento de Água - Urbano	257	214	**471**	3.826,61	11.185,71	**15.012,32**
Contenção de Encostas	31	240	**271**	3.884,51	558,71	**4.443,22**
Drenagem Urbana	164	323	**487**	10.748,62	12.202,54	**22.951,17**
Esgotamento Sanitário	399	253	**652**	5.331,03	18.040,27	**23.371,30**
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	86	86	**172**	10.165,23	30.293,76	**40.458,99**
Regularização Fundiária	0	309	**309**	507,75	0,00	**507,75**
Renovação de Frota	383	1	**384**	320,00	23.532,82	**23.852,82**
Resíduos Sólidos	56	105	**161**	761,90	458,52	**1.220,42**
Urbanização de Favelas	88	112	**200**	4.375,27	7.721,73	**12.096,99**
TOTAL	**1.464**	**2.043**	**3.507**	**40.965,72**	**103.994,07**	**144.959,79**

3.507 *propostas* = **2.950** *novas seleções* + **557** *migradas (legado).*

EXIBIR [Valores] [% do total]

1.2 SELEÇÃO

Carteira do Novo PAC por Modalidade

Distribuição das seleções por fonte de recursos.

ORIGEM: Migradas | Novas — RECORTE: Brasil — todas as UFs

STATUS: Selecionadas | Enquadradas — FONTE: OGU | FIN — ANO: 23 | 25 | 26

MEDIDA: Quantidade | Valor — EXIBIR: Total | %

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: **migradas + novas** · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

3.507
PROPOSTAS NA CARTEIRA

OGU 2.043 · 58,3% | **FIN** 1.464 · 41,7%

OGU · FIN · posição não utilizada

Cada quadrado completo = 10 propostas.

Esgotamento Sanitário
652 PROPOSTAS
OGU **253** 38,8%
FIN **399** 61,2%

Drenagem Urbana
487 PROPOSTAS
OGU **323** 66,3%
FIN **164** 33,7%

Abastecimento de Água - Urbano
471 PROPOSTAS
OGU **214** 45,4%
FIN **257** 54,6%

Abastecimento de Água - Rural
400 PROPOSTAS
OGU **400** 100,0%
FIN **0** 0,0%

Renovação de Frota
384 PROPOSTAS
OGU **1** 0,3%
FIN **383** 99,7%

Regularização Fundiária
309 PROPOSTAS
OGU **309** 100,0%
FIN **0** 0,0%

Contenção de Encostas
271 PROPOSTAS
OGU **240** 88,6%
FIN **31** 11,4%

Urbanização de Favelas
200 PROPOSTAS
OGU **112** 56,0%
FIN **88** 44,0%

Mobilidade: Médias e Grandes Cidades
172 PROPOSTAS
OGU **86** 50,0%
FIN **86** 50,0%

Resíduos Sólidos
161 PROPOSTAS
OGU **105** 65,2%
FIN **56** 34,8%

VALOR OGU	VALOR FIN	VALOR TOTAL
R$ 40.965,72 mi	**R$ 103.994,07 mi**	**R$ 144.959,79 mi**

Mesmo recorte do 1.1: **3.507** *propostas (***2.950** *novas +* **557** *migradas). Quadrado = 10 propostas; o último é parcial; cinza = posição livre (70 por modalidade).*

2.1 SUSPENSIVAS

Cláusulas suspensivas — OGU

Contratos OGU = sem suspensiva + suspensiva retirada + suspensiva pendente.

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

1.525
CONTRATOS OGU

1.491
COM SUSPENSIVA

1.197 · 80,3%
RETIRADAS

294
PENDENTES

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção (sem SNH), sem cancelados · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	SEM SUSPENSIVA	COM CLÁUSULA SUSPENSIVA			TOTAL CONTRATOS OGU	% RETIRADA	REPASSE PENDENTE (R$ MI)
		RETIRADAS	PENDENTES	SUBTOTAL			
Abastecimento de Água - Rural	8	173	130	303	311	57,1%	608,52
Abastecimento de Água - Urbano	1	175	7	182	183	96,2%	107,55
Contenção de Encostas	0	127	45	172	172	73,8%	628,16
Drenagem Urbana	0	208	59	267	267	77,9%	2.156,64
Esgotamento Sanitário	2	121	6	127	129	95,3%	43,77
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	3	61	1	62	65	98,4%	273,23
Regularização Fundiária	20	210	26	236	256	89,0%	143,99
Resíduos Sólidos	0	83	20	103	103	80,6%	182,23
Urbanização de Favelas	0	39	0	39	39	100,0%	0,00
TOTAL	**34**	**1.197**	**294**	**1.491**	**1.525**	**80,3%**	**4.144,09**

% retirada = retiradas ÷ contratos com cláusula suspensiva. Base: **1.525** *contratos OGU do painelpac, sem cancelados e sem* **1** *com bln_pac = NÃO.* ver a conta passo a passo ⓘ · conta da coluna Em suspensiva (3.1) ⓘ

2.2 SUSPENSIVAS

Alinhamento das suspensivas

Datas de retirada pactuadas pela DMP (08/2026), por modalidade.


RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU · ANO 23 25 26

TAMANHO Repasse | Contratos · MOSTRAR Todos | Só pendentes

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU com data alinhada pela DMP (08/2026) · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

1.525 CONTRATOS OGU (2.1) → −34 sem susp. −1.197 retiradas → **294** PENDENTES (2.1) → −11 sem data → **283** PENDENTES COM DATA → +79 retiradas +1 cancel. com data → **363** NO GRÁFICO

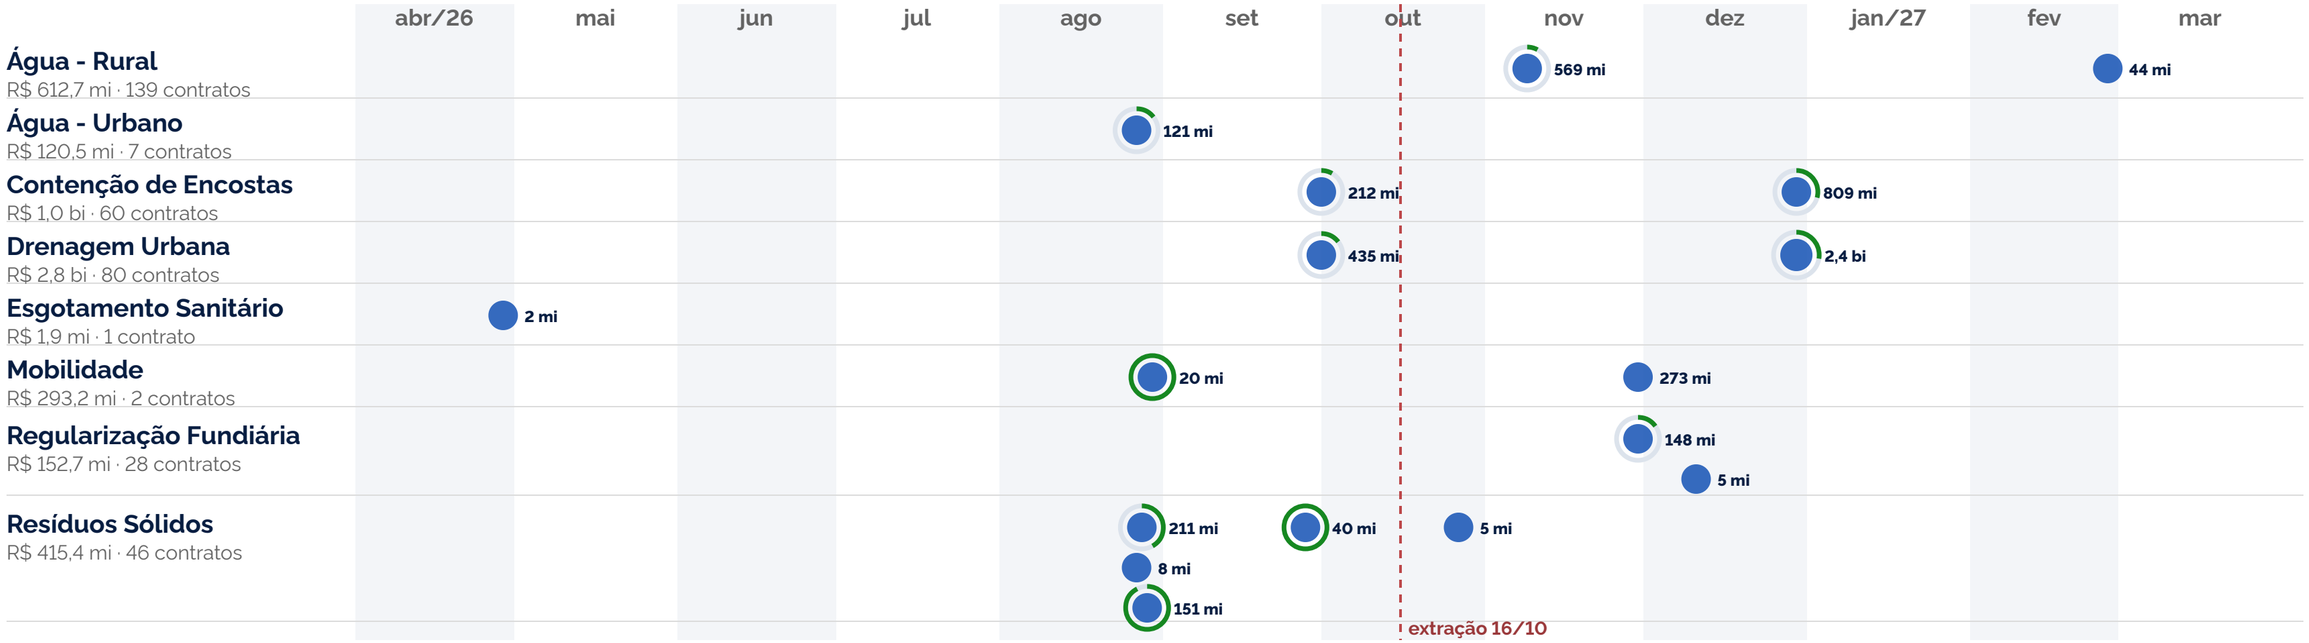

círculo = data alinhada · área ∝ repasse · número = repasse somado (R$) · anel verde = fatia já retirada · data da extração

363 > **294** *pendentes: às* **283** *pendentes com data somam-se* **79** *já retiradas e* **1** *cancelada (a data vale após a retirada);* **11** *pendentes ficaram fora do alinhamento.* ver a conta passo a passo ⓘ

11 *suspensivas pendentes do 2.1 ficaram fora do alinhamento de 08/2026 (sem data, não aparecem no gráfico) — R$ 61,3 mi de repasse.* **ver os contratos** ⓘ

Fonte: painelpac (SACI 15/10 · Transferegov 16/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10) · extração de 16/10/2026 11:35

3.1 LICITAÇÃO

Etapa atual dos contratos OGU

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

1.525 CONTRATOS OGU
slide 2.1

=

682 A CONCLUIR A LICITAÇÃO · RÉGUA NO 3.2

443 AGUARDANDO LICITAÇÃO
13 sem registro · 267 em suspensiva · 163 LAE

+

239 EDITAL PUBLICADO
sem homologação

+

415 HOMOLOGADA ATÉ AIO
250 homologada · 165 VRPL/AIO

+

428 OBRA INICIADA
28,1% dos contratos

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção, sem cancelados — etapa mais avançada · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	SEM REGISTRO	EM SUSPENSIVA	SUSPENSIVA RETIRADA/LAE	EDITAL PUBLICADO	LICITAÇÃO HOMOLOGADA	VRPL / AIO	OBRA INICIADA	TOTAL
Abastecimento de Água - Rural	8	122	19	53	38	6	**65**	**311**
Abastecimento de Água - Urbano	0	5	10	34	51	21	**62**	**183**
Contenção de Encostas	0	40	32	19	29	24	**28**	**172**
Drenagem Urbana	0	54	39	47	40	22	**65**	**267**
Esgotamento Sanitário	2	0	10	19	32	38	**28**	**129**
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	2	1	7	19	11	3	**22**	**65**
Regularização Fundiária	1	26	14	33	31	21	**130**	**256**
Resíduos Sólidos	0	19	29	14	14	17	**10**	**103**
Urbanização de Favelas	0	0	3	1	4	13	**18**	**39**
TOTAL	**13**	**267**	**163**	**239**	**250**	**165**	**428**	**1.525**

*De **2.043** seleções OGU (slide 1.1) a **1.525** contratos OGU: migradas, seleções sem contrato, bln_pac = NÃO, sem modalidade e cancelados saem; contratos sem proposta ligada entram.* ver a conta passo a passo ⓘ · conta da coluna Em suspensiva (3.1) ⓘ · conta até a régua (3.2) ⓘ · conta do edital até o fim da licitação (3.2) ⓘ

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

MEDIDA Quantidade Valor ETAPA Publicação do edital Fim da licitação

3.2 LICITAÇÃO


Régua do prazo: antes × agora

Situação em **16/10/2026** · Contagem: contratos OGU em Contratado - Normal, aguardando edital ou homologação · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

A REGRA · ART. 36-A DA PC 32/2024 (INCLUÍDO PELA PC 48/2026)

LAE — até 60 dias (caput) — Edital publicado — até 120 dias (§ 1º) — Licitação homologada — VRPL — AIO — 10 dias úteis (§ 4º) — Ordem de serviço

155 contratos sem edital publicado · 1 ponto = 1 contrato

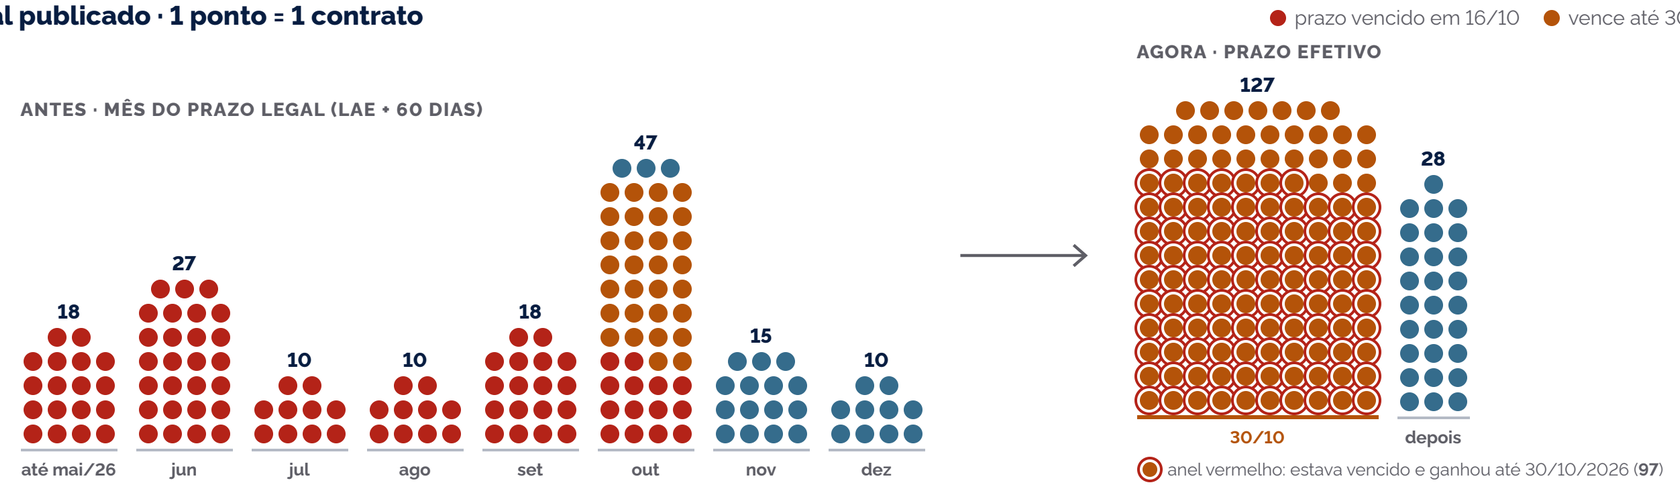

Publicação · 155 contratos com prazo

Antes	97	30	28
Agora	127		28

Homologação · 257 contratos com prazo

Antes	160	21	76
Agora	181		76

Contratos OGU em Contratado - Normal. Prazo efetivo = o maior entre o legal e 30/10/2026, na data da extração. Inclui **59** *sem edital e* **219** *sem homologação assinados antes de 21/10/2025 (PC 72)* **em simulação***: o painelpac não lhes dá prazo; aqui vale a mesma regra.* **2** *sem LAE ficam fora. Clique num ponto para abrir no SACI.* conta até a régua (3.2) ⓘ · conta do edital até o fim da licitação (3.2) ⓘ

CONTRATOS PC 72 Incluir (mesma regra) Fora

4.1 CONTRATAÇÃO

Selecionado × contratado

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

3.507 PROPOSTAS (1.1) · R$ 145,0 BI → −557 migradas → **2.950** SELEÇÕES · R$ 127,7 BI → −1.345 sem contrato assinado → **1.605** COM CONTRATO · 54,4% · R$ 35,8 BI → +118 sem seleção ligada → **1.708** ASSINADOS · R$ 47,2 BI

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Contagem: novas seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	SELEÇÕES	CONTRATOS ASSINADOS	EM CONTRATAÇÃO	CANCELADOS / DISTRATADOS	% ASSINADO	INVESTIMENTO ASSINADO (R$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	400	**303**	8	11	75,8%	1.170,65
Abastecimento de Água - Urbano	359	**231**	25	83	64,3%	5.965,80
Contenção de Encostas	233	**177**	13	20	76,0%	3.078,62
Drenagem Urbana	439	**294**	20	69	67,0%	11.593,38
Esgotamento Sanitário	419	**182**	22	127	43,4%	8.479,72
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	134	**82**	22	20	61,2%	8.485,69
Regularização Fundiária	309	**255**	1	9	82,5%	501,81
Renovação de Frota	384	**27**	18	57	7,0%	2.052,15
Resíduos Sólidos	158	**104**	20	34	65,8%	739,28
Urbanização de Favelas	115	**53**	32	30	46,1%	5.104,12
TOTAL	**2.950**	**1.708**	**181**	**460**	**57,9%**	**47.171,22**

ver a conta passo a passo ⓘ · *Seleções = as **2.950** novas seleções do slide 1.1; as **557** migradas (legado) entram direto na execução (slides 5.1 e 5.2). Sem os **1** contratos com bln_pac = NÃO no SACI e os **19** sem modalidade (exceção provisória, a revisar). Proposta com OGU e FIN conta uma vez em cada fonte.*

4.2 CONTRATAÇÃO

Situação dos contratos assinados

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

1.708 ASSINADOS

1.328 NORMAL

338 EM SUSPENSIVA

R$ 52,8 bi REPASSE / FINANCIAMENTO

Atualizado em **15/10/2026** · Contagem: contratos assinados do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

MODALIDADE	NORMAL	SUSPENSIVA	CONCLUÍDO	OUTROS*	TOTAL	QTD. OGU	QTD. FIN	REPASSE / FINANC. (R$ MI)
Abastecimento de Água - Rural	172	128	0	3	303	303	0	1.026,25
Abastecimento de Água - Urbano	206	22	2	1	231	183	48	5.737,26
Contenção de Encostas	132	45	0	0	177	172	5	2.972,04
Drenagem Urbana	222	67	0	5	294	267	27	11.219,88
Esgotamento Sanitário	157	19	0	6	182	127	55	7.774,04
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	72	3	5	2	82	64	18	13.683,47
Regularização Fundiária	228	26	0	1	255	255	0	486,85
Renovação de Frota	8	3	14	2	27	0	14	4.500,50
Resíduos Sólidos	83	20	1	0	104	103	1	731,08
Urbanização de Favelas	48	5	0	0	53	39	14	4.664,86
TOTAL	**1.328**	**338**	**22**	**20**	**1.708**	**1.513**	**182**	**52.796,24**

** Outros: em TCE, liminar e em prestação de contas. Os* **1.708** *assinados são os do slide 4.1.* ver a conta passo a passo ⓘ · conta das suspensivas (2.1) ⓘ

MODALIDADE Todas as modalidades · RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN · ANO 23 25 26

SITUAÇÃO DA OBRA SACI + balanço · Só SACI

5.1 EXECUÇÃO

Execução média e paralisações

35,9% % FÍSICO MÉDIO

42,1% % FINANCEIRO MÉDIO

85 PARALISADAS

R$ 1,6 bi INVESTIMENTO PARALISADO

Atualizado em **15/10/2026** · Médias: obras em execução ou paralisadas (média simples por contrato) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil** · Modalidade: **todas**

MODALIDADE	% FÍSICO MÉDIO — NOVAS SELEÇÕES	% FÍSICO MÉDIO — MIGRADAS	% FÍSICO MÉDIO — TOTAL	% FINANCEIRO MÉDIO	PARALISADAS	INVESTIMENTO PARALISADO (R$ MI)	CONCLUÍDAS
Abastecimento de Água - Rural	20,7%	—	**20,7%**	18,8%	0	0,00	0
Abastecimento de Água - Urbano	20,1%	61,0%	**39,6%**	41,9%	**13**	116,73	53
Contenção de Encostas	15,1%	24,3%	**19,8%**	24,3%	**11**	133,90	4
Drenagem Urbana	13,1%	55,3%	**28,6%**	30,0%	**7**	337,26	14
Esgotamento Sanitário	24,3%	57,6%	**48,9%**	45,0%	**33**	513,59	90
Mobilidade: Médias e Grandes Cidades	18,2%	56,7%	**31,7%**	32,9%	**6**	403,40	23
Regularização Fundiária	22,1%	—	**22,1%**	74,5%	**1**	3,03	0
Renovação de Frota	52,4%	—	**52,4%**	15,5%	0	0,00	82
Resíduos Sólidos	10,1%	—	**10,1%**	27,6%	0	0,00	3
Urbanização de Favelas	5,5%	59,9%	**43,1%**	42,7%	**14**	101,32	27
TOTAL	**24,9%**	**54,8%**	**35,9%**	**42,1%**	**85**	**1.609,24**	**296**

*Investimento paralisado: migradas pelo valor da base GM (pós-2023); demais pelo investimento do SACI. Situação da obra pelo SACI + balanço jun/26 (+ **194** itens do balanço sem contrato no SACI, com o % físico do balanço).*

Fonte: SACI (view_mat_carteira_investimento) e Balanço Governa (30/06/2026) · extração de 16/10/2026 11:35

5.2 EXECUÇÃO

Da seleção à obra


Quanto das seleções já virou contrato, obra iniciada e obra concluída.

ORIGEM: Migradas | **Novas** · RECORTE: **Brasil — todas as UFs**

STATUS: **Selecionadas** | **Enquadradas** · FONTE: **OGU** | **FIN** · ANO: **23** | **25** | **26**

MEDIDA: **Quantidade** | Valor · EXIBIR: **Total** | %

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Seleções (GM) × contratos (SACI) · Origem: **somente novas** · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

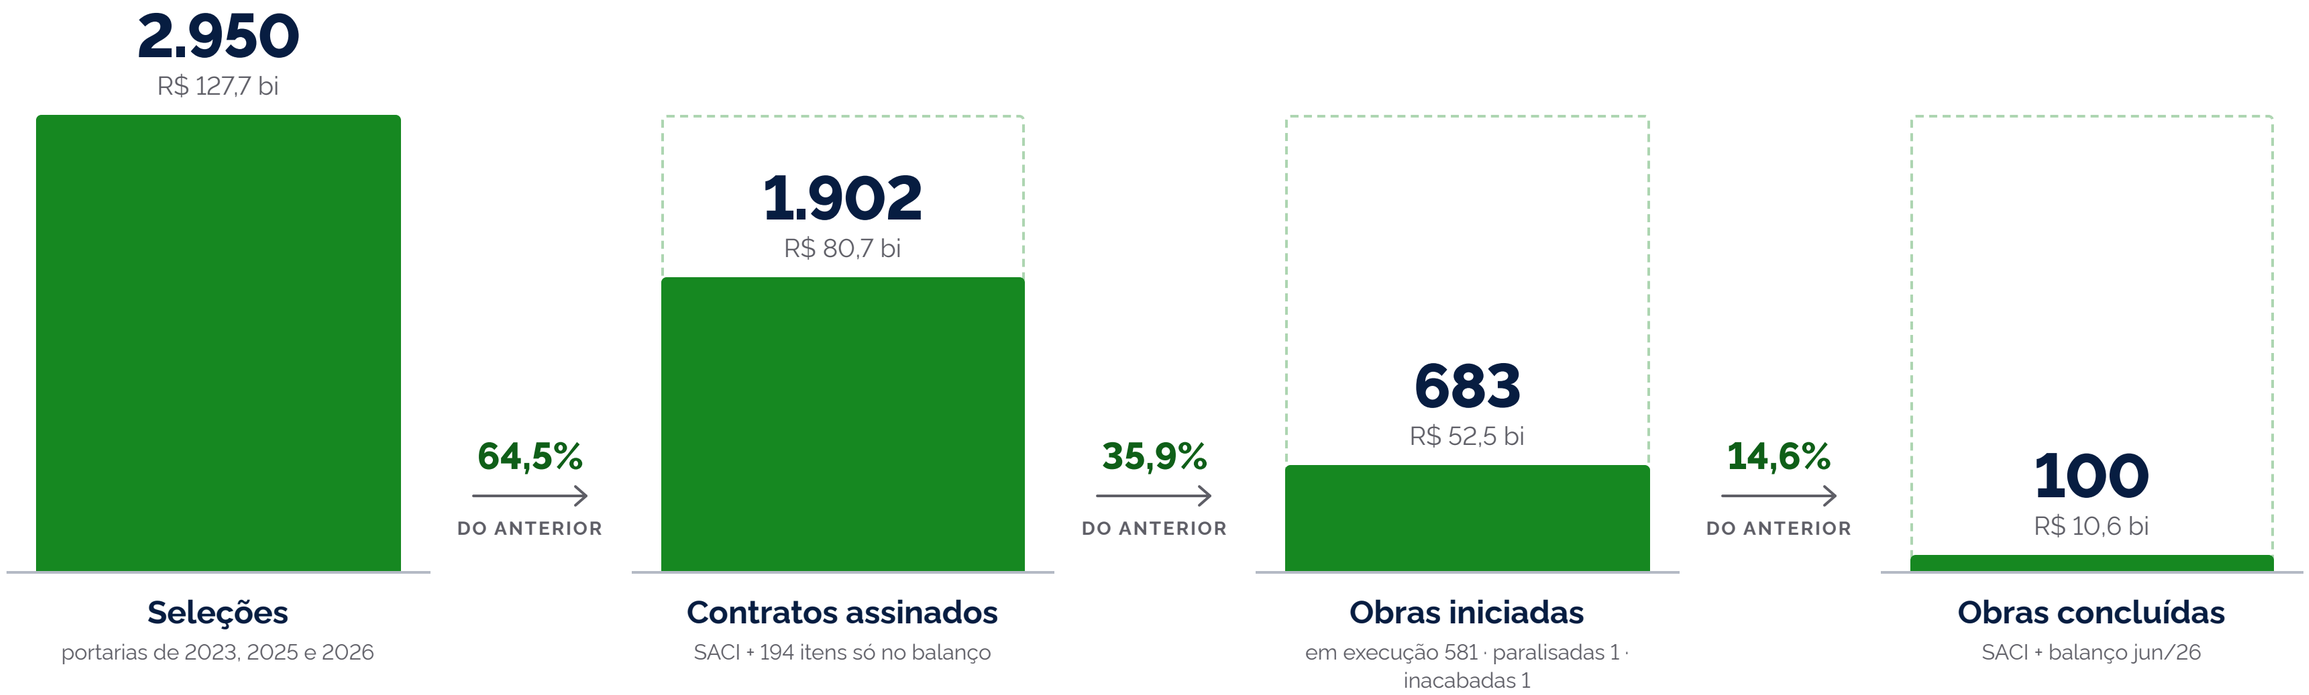

Só as novas seleções, como no 4.1. Obra: SACI + balanço jun/26, com **194** *itens só no balanço (valor: total previsto Novo PAC). Sem itens sem modalidade (exceção provisória, a revisar). Assinados* **1.902** *=* **1.708** *do SACI (slide 4.1) +* **194** *itens do balanço sem contrato no SACI.*
conta dos assinados (4.1) ⓘ *Valor: seleções pela portaria; contratos pelo repasse do SACI. Setas: conversão sobre o bloco anterior.*

SITUAÇÃO DA OBRA: **SACI + balanço** | Só SACI

CONCLUÍDAS: **Pela situação** | + obras com ≥ 95% físico

Fonte: base GM, SACI e Balanço Governa (30/06/2026) · extração de 16/10/2026 11:35

Obrigado.

Novo PAC — Ministério das Cidades.

SELEÇÃO
Base única GM (se_cgpac) · atualizada em 09/10/2026

SUSPENSIVAS E LICITAÇÃO
painelpac — SACI 15/10 · Transferegov 16/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10

EXTRAÇÃO DO BANCO
16/10/2026 às 11:35

CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO
SACI — view_mat_carteira_investimento · 15/10/2026

SITUAÇÃO DAS OBRAS (2ª FONTE)
Balanço Governa — se_cgpac.balancojun2026_com_inativas · referência 30/06/2026
