SECRETARIA-EXECUTIVA

# Novo PAC — MCid

*Balanço da carteira — da seleção à execução das obras.*

01 **Seleção**

02 **Suspensivas**

03 **Licitação**

04 **Contratação**

05 **Execução**

1.1 SELEÇÃO

# Carteira de seleções

ORIGEM [Migradas] [Novas] RECORTE Brasil — todas as UFs

STATUS [Selecionadas] [Enquadradas] FONTE [OGU] [FIN] ANO [23] [25] [26]

**3.507**
PROPOSTAS

**R$ 145,0 bi**
VALOR TOTAL

**R$ 41,0 bi**
OGU

**R$ 104,0 bi**
FINANCIAMENTO

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: migradas + novas seleções · Origem: **migradas + novas** · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | QTD. FIN | QTD. OGU | TOTAL | VALOR OGU (R$ MI) | VALOR FIN (R$ MI) | VALOR TOTAL (R$ MI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 0 | 400 | **400** | 1.044,80 | 0,00 | **1.044,80** |
| Abastecimento de Água - Urbano | 257 | 214 | **471** | 3.826,61 | 11.185,71 | **15.012,32** |
| Contenção de Encostas | 31 | 240 | **271** | 3.884,51 | 558,71 | **4.443,22** |
| Drenagem Urbana | 164 | 323 | **487** | 10.748,62 | 12.202,54 | **22.951,17** |
| Esgotamento Sanitário | 399 | 253 | **652** | 5.331,03 | 18.040,27 | **23.371,30** |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 86 | 86 | **172** | 10.165,23 | 30.293,76 | **40.458,99** |
| Regularização Fundiária | 0 | 309 | **309** | 507,75 | 0,00 | **507,75** |
| Renovação de Frota | 383 | 1 | **384** | 320,00 | 23.532,82 | **23.852,82** |
| Resíduos Sólidos | 56 | 105 | **161** | 761,90 | 458,52 | **1.220,42** |
| Urbanização de Favelas | 88 | 112 | **200** | 4.375,27 | 7.721,73 | **12.096,99** |
| **TOTAL** | **1.464** | **2.043** | **3.507** | **40.965,72** | **103.994,07** | **144.959,79** |

**3.507** *propostas* = **2.950** *novas seleções (detalhadas por ano no slide 1.2)* + **557** *migradas (legado).*

EXIBIR [Valores] [% do total]

1.2
SELEÇÃO

# Novas seleções por ano

*Portarias de 2023, 2025 e 2026 — selecionadas e enquadradas/habilitadas.*

RECORTE Brasil — todas as UFs

STATUS Selecionadas | Enquadradas  FONTE OGU | FIN  ANO 23 | 25 | 26

Atualizado em **09/10/2026** · Contagem: novas seleções, sem migradas · Status: **selecionadas + enquadradas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| | QUANTIDADE | | | | VALOR (R$ MI) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADE | 2023 | 2025 | 2026 | TOTAL | 2023 | 2025 | 2026 | TOTAL |
| Abastecimento de Água - Rural | 247 | 153 | 0 | **400** | 400,00 | 644,80 | 0,00 | **1.044,80** |
| Abastecimento de Água - Urbano | 271 | 51 | 37 | **359** | 6.770,16 | 4.743,78 | 1.046,72 | **12.560,65** |
| Contenção de Encostas | 122 | 103 | 8 | **233** | 1.702,69 | 1.432,34 | 476,83 | **3.611,86** |
| Drenagem Urbana | 221 | 187 | 31 | **439** | 9.305,93 | 9.068,91 | 2.044,35 | **20.419,20** |
| Esgotamento Sanitário | 302 | 55 | 62 | **419** | 10.201,54 | 4.973,86 | 2.029,32 | **17.204,72** |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 86 | 21 | 27 | **134** | 21.708,01 | 5.693,15 | 9.002,14 | **36.403,30** |
| Regularização Fundiária | 259 | 0 | 50 | **309** | 313,01 | 0,00 | 194,74 | **507,75** |
| Renovação de Frota | 111 | 170 | 103 | **384** | 11.512,38 | 5.528,74 | 6.811,69 | **23.852,82** |
| Resíduos Sólidos | 81 | 72 | 5 | **158** | 703,11 | 476,19 | 10,20 | **1.189,50** |
| Urbanização de Favelas | 59 | 38 | 18 | **115** | 5.267,76 | 3.674,21 | 1.949,26 | **10.891,24** |
| **TOTAL** | **1.759** | **850** | **341** | **2.950** | **67.884,58** | **36.235,98** | **23.565,27** | **127.685,84** |

*Somadas as **557** migradas (legado), são **3.507** propostas — o total do slide 1.1.*

2.1 SUSPENSIVAS

# Cláusulas suspensivas — OGU

*Contratos OGU = sem suspensiva + suspensiva retirada + suspensiva pendente.*

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

**1.582**
CONTRATOS OGU

**1.491**
COM SUSPENSIVA

**1.197 · 80,3%**
RETIRADAS

**294**
PENDENTES

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção (sem SNH), sem cancelados · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| | | COM CLÁUSULA SUSPENSIVA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADE | SEM SUSPENSIVA | RETIRADAS | PENDENTES | SUBTOTAL | TOTAL CONTRATOS OGU | % RETIRADA | REPASSE PENDENTE (R$ MI) |
| Abastecimento de Água - Rural | 8 | 173 | 130 | 303 | 311 | 57,1% | 608,52 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 1 | 175 | 7 | 182 | 183 | 96,2% | 107,55 |
| Contenção de Encostas | 0 | 127 | 45 | 172 | 172 | 73,8% | 628,16 |
| Drenagem Urbana | 0 | 208 | 59 | 267 | 267 | 77,9% | 2.156,64 |
| Esgotamento Sanitário | 2 | 121 | 6 | 127 | 129 | 95,3% | 43,77 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 3 | 61 | 1 | 62 | 65 | 98,4% | 273,23 |
| Regularização Fundiária | 20 | 210 | 26 | 236 | 256 | 89,0% | 143,99 |
| Resíduos Sólidos | 0 | 83 | 20 | 103 | 103 | 80,6% | 182,23 |
| Urbanização de Favelas | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 100,0% | 0,00 |
| Outras / sem modalidade | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | — | 0,00 |
| **TOTAL** | **91** | **1.197** | **294** | **1.491** | **1.582** | **80,3%** | **4.144,09** |

*% retirada = retiradas ÷ contratos com cláusula suspensiva.*

2.2 SUSPENSIVAS

# Prazo das suspensivas pendentes

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

**294** PENDENTES

**263** PRAZO INICIAL VENCIDO

**32** TETO DA PRORROGAÇÃO VENCIDO

**1** VENCEM EM 30 DIAS

Situação em **15/10/2026** · Contagem: suspensivas pendentes (OGU) · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| | | PRAZO INICIAL (PC 48/2026) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADE | PENDENTES | NO PRAZO | VENCE EM 30 DIAS | VENCIDO | TETO DA PRORROGAÇÃO VENCIDO | SEM PRAZO CALCULADO |
| Abastecimento de Água - Rural | 130 | 0 | 1 | 127 | 0 | 2 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Contenção de Encostas | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Drenagem Urbana | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Esgotamento Sanitário | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Regularização Fundiária | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resíduos Sólidos | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| **TOTAL** | **294** | **26** | **1** | **263** | **32** | **4** |

*Prazo contado da assinatura (PC 48/2026, art. 12): 6, 8 ou 10 meses conforme o nível do contrato; prorrogação única até 8, 12 ou 14 meses. Situação em 15/10/2026.*

2.3 SUSPENSIVAS

# Alinhamento das suspensivas


*Datas de retirada das suspensivas pactuadas pela DMP em 08/2026, por modalidade.*

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU · ANO 23 25 26

TAMANHO Repasse · Contratos

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU com data alinhada pela DMP (08/2026) · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

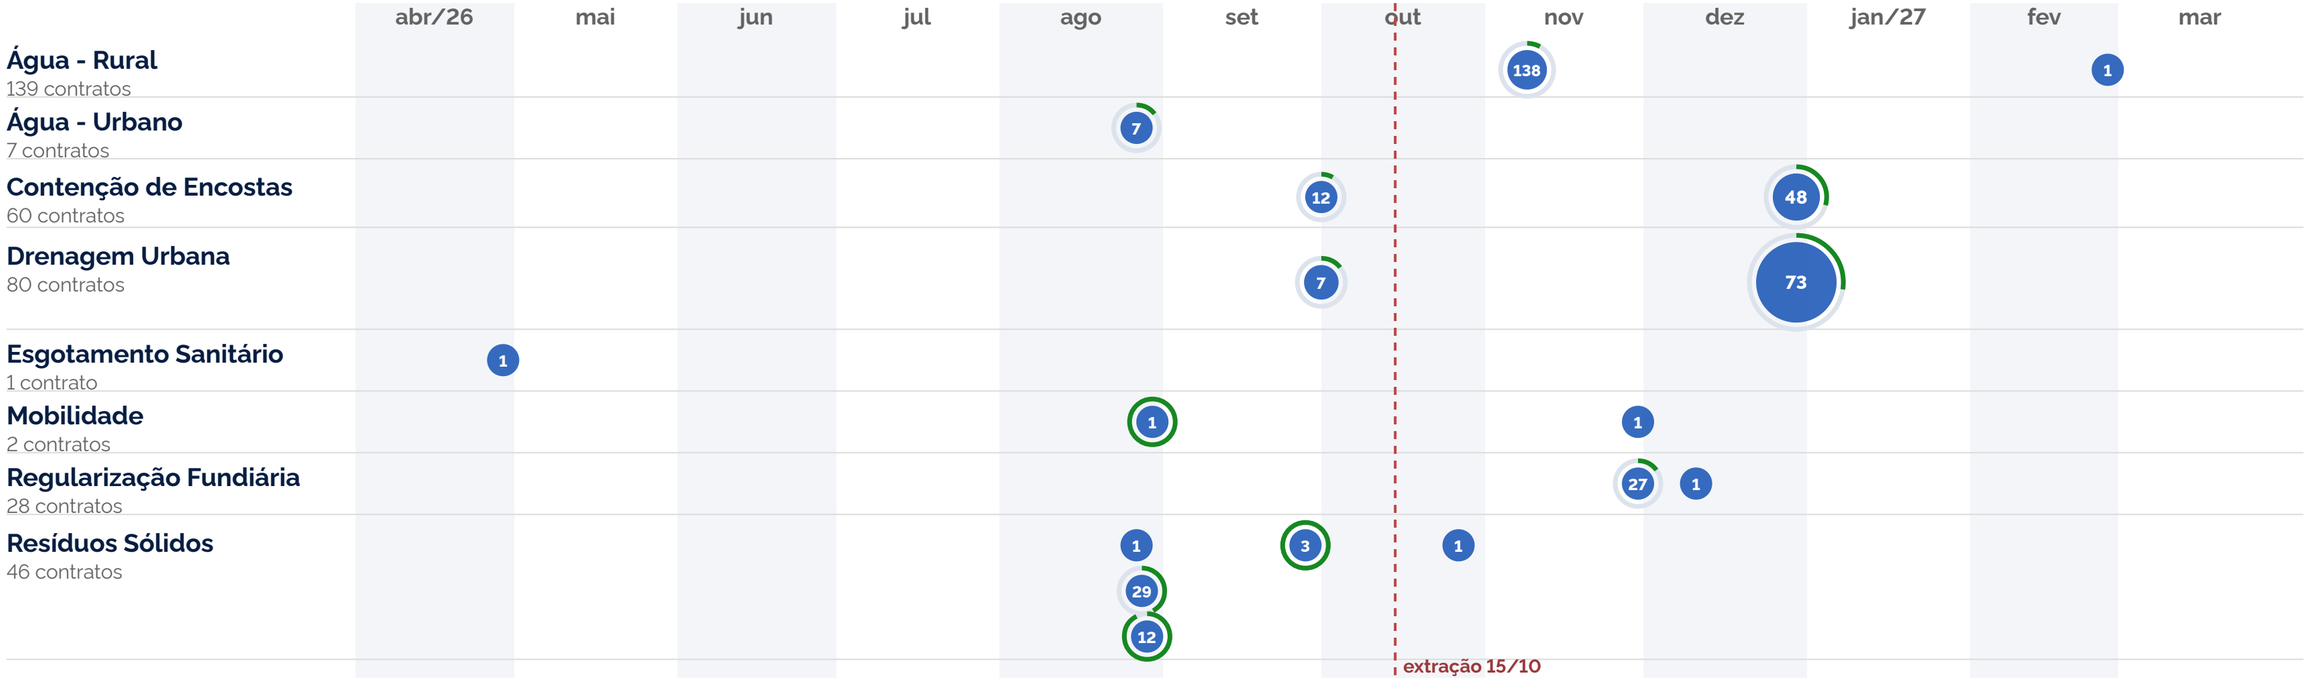


círculo = data alinhada · área ∝ repasse · número = contratos · anel verde = fatia já retirada · data da extração

**363** *com data alinhada =* **283** *pendentes +* **79** *já retiradas +* **1** *cancelado(s) — a data é fixa e continua valendo depois da retirada. As* **294** *pendentes do slide 2.1 =* **283** *com data alinhada +* **11** *sem data (contratos que não entraram no alinhamento de 08/2026).*

3.1 LICITAÇÃO

# Etapa atual dos contratos OGU

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

**496**
AGUARDANDO LICITAÇÃO

**239**
EDITAL PUBLICADO

**419**
HOMOLOGADA ATÉ AIO

**428 · 27,1%**
OBRA INICIADA

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU do Novo PAC Seleção, sem cancelados — etapa mais avançada · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | SEM REGISTRO | EM SUSPENSIVA | SUSPENSIVA RETIRADA/LAE | EDITAL PUBLICADO | LICITAÇÃO HOMOLOGADA | VRPL / AIO | OBRA INICIADA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 8 | 122 | 19 | 54 | 37 | 6 | **65** | **311** |
| Abastecimento de Água - Urbano | 0 | 5 | 10 | 34 | 51 | 21 | **62** | **183** |
| Contenção de Encostas | 0 | 40 | 32 | 19 | 29 | 24 | **28** | **172** |
| Drenagem Urbana | 0 | 54 | 40 | 47 | 39 | 22 | **65** | **267** |
| Esgotamento Sanitário | 2 | 0 | 10 | 19 | 32 | 38 | **28** | **129** |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 2 | 1 | 7 | 19 | 11 | 3 | **22** | **65** |
| Regularização Fundiária | 1 | 26 | 14 | 33 | 31 | 21 | **130** | **256** |
| Resíduos Sólidos | 0 | 19 | 30 | 13 | 14 | 17 | **10** | **103** |
| Urbanização de Favelas | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | **18** | **39** |
| Outras / sem modalidade | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **57** |
| **TOTAL** | **64** | **267** | **165** | **239** | **254** | **165** | **428** | **1.582** |

3.2 LICITAÇÃO

# Prazos da licitação — art. 36-A

*Publicação em até 60 dias da LAE e homologação em até 120 dias da publicação — data-limite de 30/10/2026.*

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU ANO 23 25 26

Situação em **15/10/2026** · Contagem: contratos OGU assinados após a PC 72/2025, com LAE · Fonte: **OGU** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | | | | HOMOLOGAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADE | PUBLICADO | NO PRAZO | VENCE EM 30 DIAS | VENCIDO | HOMOLOGADA | NO PRAZO | VENCE EM 30 DIAS | VENCIDO |
| Abastecimento de Água - Rural | **2** | 7 | 9 | 0 | **8** | 0 | 0 | 0 |
| Abastecimento de Água - Urbano | **1** | 0 | 0 | 0 | **1** | 1 | 0 | 0 |
| Contenção de Encostas | **23** | 5 | 23 | 0 | **16** | 9 | 1 | 0 |
| Drenagem Urbana | **37** | 2 | 31 | 0 | **25** | 10 | 6 | 0 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | **1** | 0 | 1 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 |
| Regularização Fundiária | **15** | 0 | 9 | 0 | **8** | 3 | 4 | 0 |
| Resíduos Sólidos | **6** | 0 | 11 | 0 | **4** | 4 | 1 | 0 |
| Outras / sem modalidade | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **85** | **14** | **84** | **0** | **65** | **27** | **12** | **0** |

*Prazos vencidos ou vencendo antes de 30/10/2026 passam para 30/10/2026 (regra do painelpac). Situação em 15/10/2026.*

4.1 CONTRATAÇÃO

# Selecionado × contratado

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

**2.950** SELEÇÕES

**1.742** CONTRATOS ASSINADOS

**59,1%** % ASSINADO

**R$ 47,6 bi** INVESTIMENTO ASSINADO

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Contagem: novas seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | SELEÇÕES | CONTRATOS ASSINADOS | EM CONTRATAÇÃO | CANCELADOS / DISTRATADOS | % ASSINADO | INVESTIMENTO ASSINADO (R$ MI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 400 | **303** | 8 | 11 | 75,8% | 1.170,65 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 359 | **231** | 25 | 83 | 64,3% | 5.965,80 |
| Contenção de Encostas | 233 | **177** | 13 | 20 | 76,0% | 3.078,62 |
| Drenagem Urbana | 439 | **294** | 20 | 69 | 67,0% | 11.593,38 |
| Esgotamento Sanitário | 419 | **182** | 22 | 127 | 43,4% | 8.479,72 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 134 | **82** | 22 | 20 | 61,2% | 8.485,69 |
| Regularização Fundiária | 309 | **255** | 1 | 9 | 82,5% | 501,81 |
| Renovação de Frota | 384 | **27** | 18 | 57 | 7,0% | 2.052,15 |
| Resíduos Sólidos | 158 | **104** | 20 | 34 | 65,8% | 739,28 |
| Urbanização de Favelas | 115 | **53** | 32 | 30 | 46,1% | 5.104,12 |
| Outras / sem modalidade | 0 | **34** | 42 | 1 | — | 421,45 |
| **TOTAL** | **2.950** | **1.742** | **223** | **461** | **59,1%** | **47.592,67** |

*Seleções = as **2.950** novas seleções do slide 1.2; as **557** migradas (legado) entram direto na execução (slides 5.1 e 5.2). Proposta com OGU e FIN conta uma vez em cada fonte.*

Fonte: base única GM e SACI (view_mat_carteira_investimento) · extração de 15/10/2026 18:11

4.2 CONTRATAÇÃO

# Situação dos contratos assinados

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

**1.742** ASSINADOS

**1.362** NORMAL

**338** EM SUSPENSIVA

**R$ 53,2 bi** REPASSE / FINANCIAMENTO

Atualizado em **15/10/2026** · Contagem: contratos assinados do Novo PAC Seleção (SACI) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | NORMAL | SUSPENSIVA | CONCLUÍDO | OUTROS* | TOTAL | QTD. OGU | QTD. FIN | REPASSE / FINANC. (R$ MI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 172 | 128 | 0 | 3 | 303 | 303 | 0 | 1.026,25 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 206 | 22 | 2 | 1 | 231 | 183 | 48 | 5.737,26 |
| Contenção de Encostas | 132 | 45 | 0 | 0 | 177 | 172 | 5 | 2.972,04 |
| Drenagem Urbana | 222 | 67 | 0 | 5 | 294 | 267 | 27 | 11.219,88 |
| Esgotamento Sanitário | 157 | 19 | 0 | 6 | 182 | 127 | 55 | 7.774,04 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 72 | 3 | 5 | 2 | 82 | 64 | 18 | 13.683,47 |
| Regularização Fundiária | 228 | 26 | 0 | 1 | 255 | 255 | 0 | 486,85 |
| Renovação de Frota | 8 | 3 | 14 | 2 | 27 | 0 | 14 | 4.500,50 |
| Resíduos Sólidos | 83 | 20 | 1 | 0 | 104 | 103 | 1 | 731,08 |
| Urbanização de Favelas | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 | 39 | 14 | 4.664,86 |
| Outras / sem modalidade | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 401,83 |
| **TOTAL** | **1.362** | **338** | **22** | **20** | **1.742** | **1.529** | **200** | **53.198,07** |

** Outros: em TCE, liminar e em prestação de contas.*

4.3 CONTRATAÇÃO

# Da seleção à obra


*Quanto das seleções já virou contrato assinado, obra iniciada e obra concluída.*

ORIGEM [Migradas] [Novas] RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE [OGU] [FIN] ANO [23] [25] [26]

MEDIDA [Quantidade] [Valor] EXIBIR [Total] [%]

Atualizado em **09/10** (GM) e **15/10** (SACI) · Contagem: seleções (GM) × contratos do Novo PAC Seleção / Migrado (SACI) · Origem: **somente novas** · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

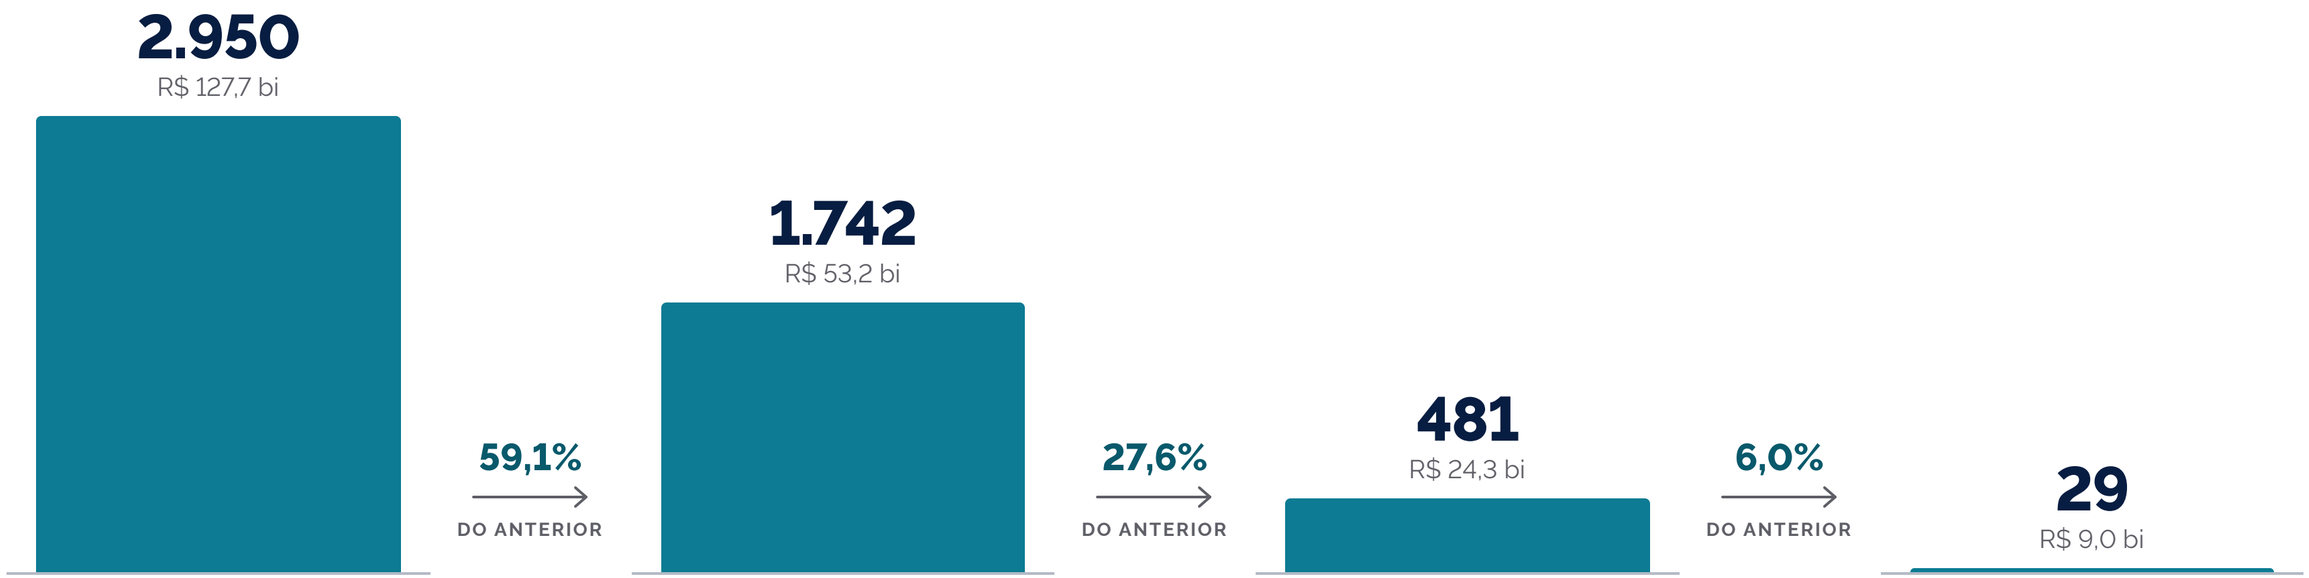


*Só as novas seleções, como no slide 4.1 (ligue Migradas para incluir o legado). Valor: seleções pela portaria (OGU + FIN); contratos e obras das novas seleções pelo repasse/financiamento do SACI. Setas: conversão em relação ao bloco anterior.*

CONCLUÍDAS [Situação no SACI] [+ obras com ≥ 95% físico]

Fonte: base única GM e SACI (view_mat_carteira_investimento) · extração de 15/10/2026 18:11

5.1 EXECUÇÃO

# Situação das obras

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

**707**
EM EXECUÇÃO

**85**
PARALISADAS

**222 · 9,0%**
CONCLUÍDAS

**1.440**
NÃO INICIADAS

Atualizado em **15/10/2026** · Contagem: contratos do Novo PAC Seleção + Migrado (SACI), sem cancelados · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | NÃO INICIADA | EM EXECUÇÃO | PARALISADA | CONCLUÍDA | INACABADA | TOTAL | % CONCLUÍDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 248 | 63 | 0 | 0 | 0 | **311** | 0,0% |
| Abastecimento de Água - Urbano | 184 | 115 | **13** | 52 | 1 | **365** | 14,2% |
| Contenção de Encostas | 157 | 57 | **11** | 3 | 0 | **228** | 1,3% |
| Drenagem Urbana | 257 | 82 | **7** | 14 | 0 | **360** | 3,9% |
| Esgotamento Sanitário | 160 | 141 | **33** | 88 | 4 | **426** | 20,7% |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 74 | 39 | **6** | 21 | 1 | **141** | 14,9% |
| Regularização Fundiária | 149 | 105 | **1** | 0 | 1 | **256** | 0,0% |
| Renovação de Frota | 28 | 3 | 0 | 14 | 0 | **45** | 31,1% |
| Resíduos Sólidos | 111 | 12 | 0 | 3 | 0 | **126** | 2,4% |
| Urbanização de Favelas | 62 | 65 | **14** | 27 | 1 | **169** | 16,0% |
| Outras / sem modalidade | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | **35** | 0,0% |
| **TOTAL** | **1.440** | **707** | **85** | **222** | **8** | **2.462** | **9,0%** |

*Total = **1.921** contratos do Novo PAC Seleção (assinados ou em contratação) + **541** migrados, sem contratos cancelados/distratados nem obras canceladas.*

5.2 EXECUÇÃO

# Execução média e paralisações

RECORTE Brasil — todas as UFs

FONTE OGU FIN ANO 23 25 26

**35,4%** % FÍSICO MÉDIO

**41,6%** % FINANCEIRO MÉDIO

**85** PARALISADAS

**R$ 1,6 bi** INVESTIMENTO PARALISADO

Atualizado em **15/10/2026** · Médias: obras em execução ou paralisadas (média simples por contrato) · Fonte: **OGU + FIN** · Anos: **todos** · Recorte: **Brasil**

| MODALIDADE | % FÍSICO MÉDIO — NOVAS SELEÇÕES | % FÍSICO MÉDIO — MIGRADAS | % FÍSICO MÉDIO — TOTAL | % FINANCEIRO MÉDIO | PARALISADAS | INVESTIMENTO PARALISADO (R$ MI) | CONCLUÍDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimento de Água - Rural | 21,0% | — | **21,0%** | 17,5% | 0 | 0,00 | 0 |
| Abastecimento de Água - Urbano | 19,1% | 61,0% | **39,4%** | 41,9% | **13** | 116,73 | 52 |
| Contenção de Encostas | 15,5% | 24,3% | **20,0%** | 24,3% | **11** | 133,90 | 3 |
| Drenagem Urbana | 13,8% | 56,8% | **31,2%** | 31,3% | **7** | 337,26 | 14 |
| Esgotamento Sanitário | 23,6% | 58,5% | **49,9%** | 45,8% | **33** | 513,59 | 88 |
| Mobilidade: Médias e Grandes Cidades | 14,6% | 58,3% | **35,0%** | 35,6% | **6** | 403,40 | 21 |
| Regularização Fundiária | 25,9% | — | **25,9%** | 73,9% | **1** | 3,03 | 0 |
| Renovação de Frota | 12,0% | — | **12,0%** | 15,5% | 0 | 0,00 | 14 |
| Resíduos Sólidos | 10,9% | — | **10,9%** | 27,6% | 0 | 0,00 | 3 |
| Urbanização de Favelas | 1,7% | 59,9% | **42,9%** | 42,7% | **14** | 101,32 | 27 |
| Outras / sem modalidade | 46,6% | — | **46,6%** | 17,5% | 0 | 0,00 | 0 |
| **TOTAL** | **19,7%** | **55,5%** | **35,4%** | **41,6%** | **85** | **1.609,24** | **222** |

*Investimento paralisado: migradas pelo valor da base GM (pós-2023: repasse menos o desembolsado até 2022); novas seleções pelo investimento do SACI.*

# Obrigado.

*Novo PAC — Ministério das Cidades.*

**SELEÇÃO**
Base única GM (se_cgpac) · atualizada em 09/10/2026

**SUSPENSIVAS E LICITAÇÃO**
painelpac — SACI 15/10 · Transferegov 15/10 · Caixa 13/10 · BDGestores 15/10

**CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO**
SACI — view_mat_carteira_investimento · 15/10/2026

**EXTRAÇÃO DO BANCO**
15/10/2026 às 18:11
